

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

📧 scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

Fonctionnement des systèmes 2

Cours méthodologie de projet

Bachelier en informatique et systèmes – Finalité Télécommunications
et réseaux –Bloc 1.

Chapelle Joakim – joakim.chapelle1@heh.be

Depreter Johan – johan.depreter@heh.be

Desmet Erwin – erwin.desmet@heh.be

Petein Thomas – thomas.petein@heh.be

Table des matières

1 Les Bonnes pratiques pour gérer un projet.....	5
1.1 Définir les objectifs du projet	5
1.2 Découper le projet et définir la liste des tâches : on ne mange une baguette qu'en la coupant en tranches.....	8
1.3 Définir l'enchaînement logique des tâches et les principaux chantiers.....	13
1.3.1 Prédécesseurs et successeurs, l'enchaînement des actions	15
1.3.2 Les types de liaisons	16
1.4 Ajouter la durée et les contraintes des tâches et ajouter des tâches externes.....	17
1.4.1 Durées ou charge de travail	17
1.4.2 Les Contraintes	17
1.5 Définir et attribuer les ressources.....	18
1.5.1 Dresser la liste des ressources	19
1.5.2 Définir les contraintes pour les ressources	19
1.5.3 Affecter les ressources	19
1.6 Planifier et assurer le suivi du projet.....	20
1.6.1 Planifier	20
1.6.2 Assurer un bon suivi	20
1.7 Faire un retour d'expérience post projet (le REX).....	22
2. Les principaux logiciels de gestion de projets	23
2.1 Les logiciels de gestion de projets simples pour des petits projets	23
2.2 La gestion de projets simples avec Trello.com.....	24
2.3 Les logiciels de gestion de projets pour les projets complexes.....	26
3. Quelques conseils pour bien gérer un projet.....	27
4. Les méthodes de gestion projet les plus connues.....	29
4.1 Liste non-exhaustives de 25 possibilités	29
4.2 Quelques méthodes en détails.....	30
4.3 Choisir la méthodologie de votre projet	31
4.4 Explication de ce qu'est une méthode de gestion de projet.....	32
4.4.1 C'est quoi, la gestion de projet ?	32
4.4.2 Quelle méthodologie choisir pour piloter vos projets ?.....	33
4.5 Explications brèves de quelques méthodes de gestion de projet.....	33
4.5.1 Agile, la gestion de projet itérative	33
4.5.2 Le Waterfall	34
4.5.3 Scrum.....	34
4.5.4 Le management de projet Kanban	35

4.5.5 La gestion de projet Scrumban.....	35
4.5.6 PRINCE2	36
4.5.7 Six Sigma	36
4.5.8 La méthode du chemin critique (Critical Path Method ou CPM)	37
4.5.9 La méthode de la chaîne critique (Critical chain project management ou CCPM)	37
4.5.10 La gestion de projet Lean	37
4.5.11 Le guide PMBOK® du Project Management Institute(PMI) sur la gestion de projet	38
4.5.12 L'eXtreme Programming (XP)	38
5 Le Cycle en V	40
5.1 Qu'est-ce que le cycle en V ?	40
5.2 Quelles sont les étapes de la méthode cycle en V?	41
5.3 La phase de conception	41
5.3.1 Analyse des besoins du clients	41
5.3.2 Conception du système	41
5.3.3 Conception générale ou architecturale.....	41
5.3.4 Spécification des composants	42
5.4 La mise en œuvre	42
5.5 La phase de validation	42
5.5.1 Test des composants	42
5.5.2 Test d'intégration	43
5.5.3 Test du système	43
5.5.4 Test d'acceptation	43
6 Les to do list.....	44
6.1 C'est quoi, une to do list ?	44
6.2 Quelle application pour une to do list ?	44
6.3 Comment faire une to do list efficace ? 15 conseils pour vous faciliter la vie	45
6.3.1 Prendre note de toutes ses idées.....	45
6.3.2 Classez ses listes	45
6.3.3 Organiser la to do list par processus, priorité ou échéance	46
6.3.4 Rendre la to do list exploitable.....	46
6.3.5 Commencer ses tâches par un verbe d'action	47
6.3.6 Hiérarchiser ses tâches.....	47
6.3.7 Définir systématiquement une échéance	47
6.3.8 Décomposer les projets en tâches plus petites.....	48
6.3.9 Regrouper les tâches similaires.....	48
6.3.10 Célébrer chaque étape accomplie.....	48

6.3.11 Trier sa liste en fin de journée	48
6.3.12 Désactiver les notifications	49
6.3.13 Apprendre à suivre l'essentiel avant tout	49
6.3.14 Surveiller tout retard éventuel et en comprendre l'origine.....	49
6.3.15 Collaborer sur une seule et même plateforme	49
7 Présentation du QQOQCP	50
7.1 Définition	50
7.2 Objectif de la démarche	50
7.3 Avantages et limites de la méthode	50
7.4 Contexte d'utilisation de la démarche	51
7.5 Le QQOCQP dans le détail	52
7.5.1 Qui ?	52
7.5.2 Quoi ?	52
7.5.3 Où ?	52
7.5.4 Quand ?	53
7.5.5 Comment ?	53
7.5.6 Combien ?	53
7.5.7 Pourquoi ?	53
7.5.8 Tableau	53
8 La matrice de compétences	54
8.1 A quel moment la matrice de compétences est-elle utile ?.....	54
8.2 Les étapes	55

1 Les Bonnes pratiques pour gérer un projet

1.1 Définir les objectifs du projet



Ce point peut paraître un peu “basique”, mais il est trop souvent négligé.

Ne pas définir les objectifs du projet peut induire un “effet tunnel” (c’est à dire se lancer et avancer jusqu’à ce que l’on se rende compte qu’on a mal compris, mais souvent tardivement), ou encore partir sur de mauvaises bases ce qui obligera plus tard à devoir refaire le travail.

Il est essentiel de clarifier les objectifs du projet (la priorité N°1, et les objectifs secondaires), **ce que l’on attend de vous (livrables, temps, délais, budgets...) et la souplesse que vous pouvez avoir.**

Il est indispensable d’écrire cela dans un document, afin de ne pas laisser de place aux malentendus, et surtout le faire valider par le donneur d’ordre.

Même si ce document est un Powerpoint de 2 slides, un fichier word d’une page, un email récapitulatif, il est essentiel de formaliser les attentes du donneur d’ordre :

- Le résultat attendu
- Le critère d’évaluation du résultat final
- Les moyens à votre disposition (et éventuellement la priorisation de vos autres activités)
- La date souhaitée de finalisation du projet
- ...

Ce document aidera également le décideur à mieux cadrer sa demande, plutôt que de juste vous donner quelques consignes orales au cours d’une réunion. Vous aurez donc la possibilité de rédiger un cahier de charges précis.

D’autres part, en faisant cela vous allez démontrer vos talents de gestionnaire de projets et donc une bonne première impression.

Si vous le pouvez, essayez d’inclure un macro planning **sans les dates**, avec :

- La date de début (c'est à dire quand vous allez vous mettre sur le projet)
- Les grandes tâches à effectuer (les étapes, la chronologie...)
- Les premiers besoins
- ...

En ne mettant pas de dates, vous pourrez faire une première liste des actions à effectuer, sans pour autant vous engager sur un planning.

Si vous ne savez pas comment définir ces différentes étapes, faites un point informel avec 1 ou 2 personnes qui connaissent le sujet, afin d'avoir leur avis et ce qu'il est nécessaire de prendre en compte. Il suffit de leur dire qu'il y a un projet (non encore validé !) de faire telle chose, et que vous leur demandez des conseils.


Parfois, vous pouvez comprendre une chose et votre manager une autre (ex: donneur d'ordre veut des résultats rapides pour montrer à sa direction que cela avance, alors que le chef de projet va passer du temps à préparer le dossier et à faire des réunions préparatoires).

Concernant les contraintes classiques d'un projet à prendre en compte lors de cette étape, vous avez généralement :

- Le temps pour le réaliser (1 semaine, 1 mois...)
- L'argent pour le faire (budget "no limit" car prioritaire ou au contraire un bricolage vite fait)
- Les fonctions que vous souhaitez y mettre ou les résultats qui sont attendus (quelle est la "killer feature" c'est à dire ce qu'il est indispensable de livrer)
- L'importance pour la direction générale ou la stratégie de l'entreprise
- ...

Sachant que ce qui est souvent décisif, c'est les facteurs temps / argent / fonctions.

Ces 3 contraintes forment un triangle, que vous pouvez changer pour faire en sorte de respecter l'une ou l'autre de ces contraintes.

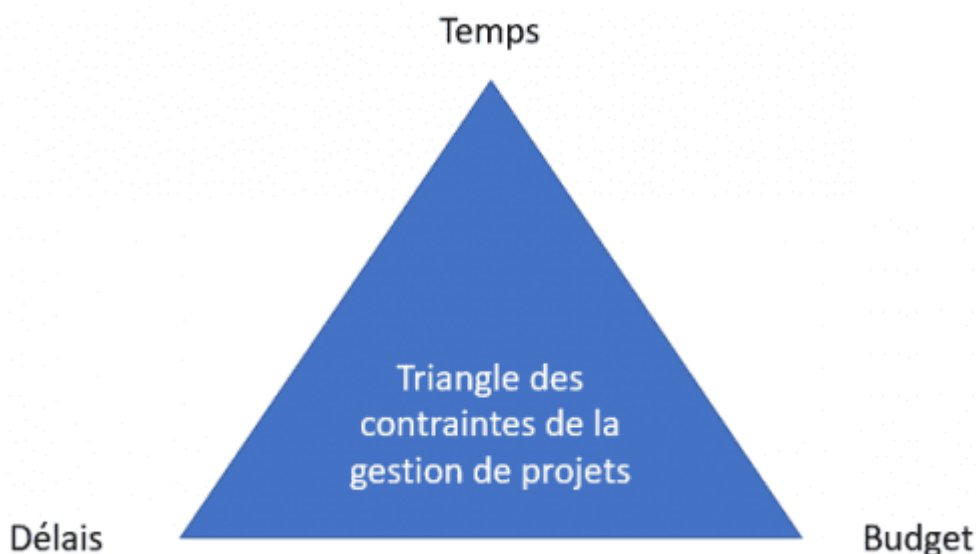

Un bon moyen de clarifier le résultat obtenu, et donc de laisser le décideur choisir lui-même afin de ne pas vous retrouver en mauvaise posture... Après tout c'est lui qui paye, c'est son projet.

A noter : si votre commanditaire ne vous propose pas de solution (ex: plus de moyens, plus de temps...), alors demander lui "Mais comment faire alors ?". Cela vous permet de lui renvoyer le problème à la figure au lieu de devoir vous justifier et trouver vous-même des solutions impossibles à tenir. Ce n'est pas votre rôle, vous ne pouvez pas faire de miracles et vous ne pouvez pas travailler à pertes.


Attention également à prendre en compte la dimension humaine d'un projet, en particulier s'il change les habitudes de travail de plusieurs personnes.

Cela concerne par exemple un changement de logiciel, de procédures établies depuis très longtemps...


En effet, ce genre de projet de "rupture" dans les habitudes va suivre 6 phases

- L'annonce du projet par la direction, avec une phase de déni (les personnes concernées pensent que le projet ne va jamais aboutir, que ce n'est pas tout de suite...)
- L'affirmation que le projet sera bien mis en place, avec la colère des personnes pour qui le changement va impacter leurs habitudes
- La compréhension que le projet va vraiment aboutir, et donc qu'il va falloir se résigner au changement, avec une phase de marchandage sur ce qui changera ou pas...
- L'acceptation, avec une démotivation des personnes qui travaillent encore avec d'anciennes méthodes qui leur convenait, et qui vont bientôt devoir changer.
- La mise en place opérationnelle du projet avec le lancement, avec les adaptations nécessaires du projet et des personnes (un élément crucial afin de réduire le rejet)
- La mise en place définitive avec les adaptations des habitudes et finalement un nouveau départ.

L'avancement du projet	La réaction des collaborateurs	La posture à tenir
Annoncé	DENI	Expliquer et rester ferme sur la décision
Entendu	COLERE	Communiquer, écouter... encadrer...
Compris	MARCHANDAGE	Définir ce qui peut être modifié ou pas
Accepté	DEMOTIVATION	Accompagner la conduite du changement
Installation	ADAPTATION	Valoriser les premiers pas, fêter les petites victoires...
Déploiement	APPROPRIATION	Mettre en place un plan d'amélioration continue

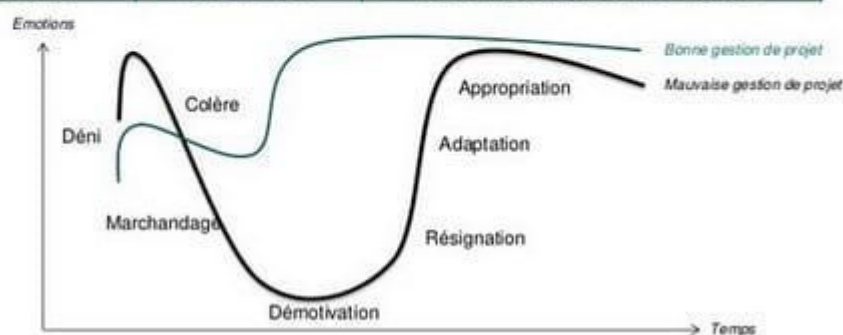

1.2 Découper le projet et définir la liste des tâches : on ne mange une baguette qu'en la coupant en tranches

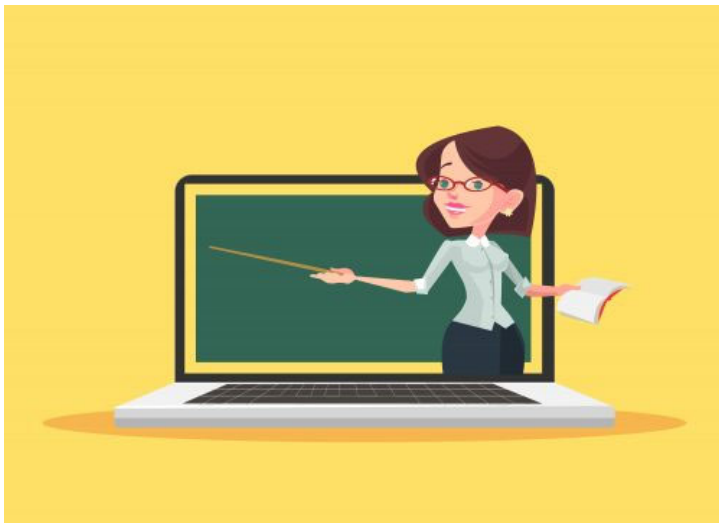

La première étape à réaliser est celle de dresser la liste des tâches à réaliser.

C'est cette étape qui est la plus délicate, car elle jette les fondations du projet.

Si l'on oublie une tâche à ce moment-là, le projet sera faussé, et sa gestion le sera donc aussi.

Listez toutes les tâches possibles et imaginables, et soyez très critique vis-à-vis de cette liste : pour chaque tâche, demandez-vous toujours *De quoi ai-je besoin au préalable pour pouvoir faire cela ? Qu'est-ce que cela implique pour le reste du projet ?*.

En procédant de cette manière, vous trouverez par déduction et par induction de nouvelles tâches que vous auriez pu oublier, des pré-requis techniques...

Autre conseil : distinguez-bien le fait de réaliser une tâche et le fait de la valider, et de la communiquer.

Comme nous l'enseignent *les lois du temps*, la plus grande partie de temps gâché est celle **avant** de réaliser l'action : les gens perdent un temps fou à se décider à effectuer une action, prenez-le en compte et découpez bien votre projet dans le détail !

Le mieux est de commencer par un papier & crayon, et de partir du but final.

En effet en partant du but à atteindre vous allez prioriser vos efforts sur cet élément, au lieu de commencer par les détails.

Ensuite, vous pouvez utiliser :


- **Soit un logiciel de gestion de projet comme** afin de transformer facilement une liste de tâches en un graphique, ce qui facilitera le suivi et les points projets.

Essayez Monday.com


Le logiciel de gestion de projets qui va **simplifier** et **automatiser** votre travail : suivi des tâches, rappels, priorités, plannings (Gantt, Kanban...), partage de documents...

Gratuit jusqu'à 5 utilisateurs

Je veux le tester ! →

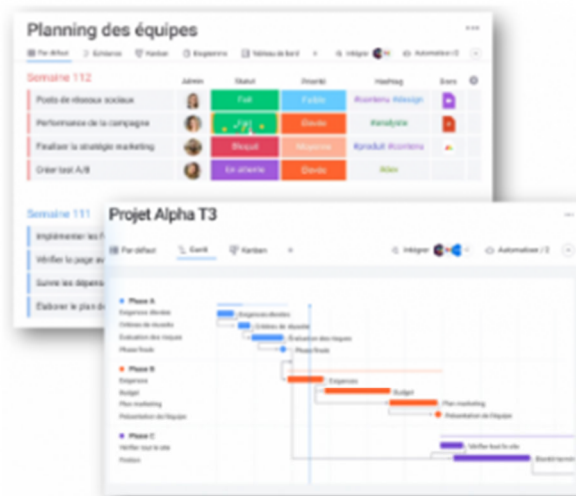

- Soit un fichier Excel avec la liste des tâches et les dates jalons, accompagné d'un fichier Powerpoint avec de grandes dates

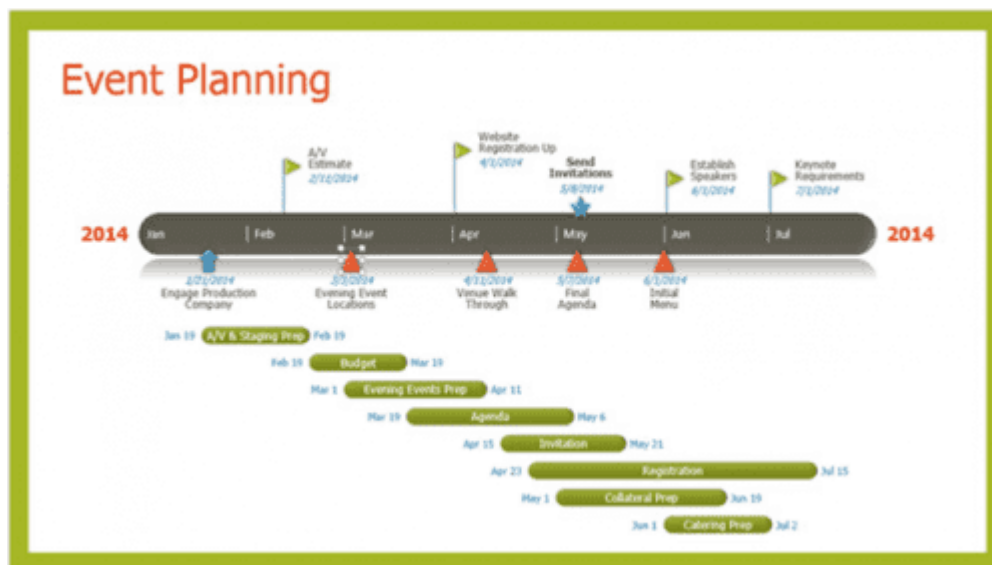

- Soit utiliser un fichier de MindMapping (plus efficace dans le cas de projets complexes pas clairs).



Dernière chose: vous n'avez pas forcément à lister les tâches par ordre parfaitement chronologique, c'est juste plus pratique pour la suite.

Attention à ne pas définir des objectifs trop ambitieux, sinon vous risquez de perdre votre crédibilité et de démoraliser les personnes de l'équipe.

Vos objectifs doivent être SMART :

- **Spécifiques** (ex: augmenter de 15 % le taux d'ouverture des emailings)
- **Mesurables** (ex: mesurer le taux d'ouverture dans les 3 mois suivant la mise en place d'un nouvel outil)
- **Atteignables** (ex: vérifier que les actions mises en place permettront effectivement d'augmenter le taux d'ouverture de 15%)
- **Réalistes** et acceptés (ex : les équipes concernées seront-elles d'accord ?)
- **Temporels** (ex: la mise en place est prévue pour le 20 août)



Cet exercice de validation des objectifs avec toutes leurs conséquences permet parfois de déceler des incohérences, et donc de revoir les objectifs.


Voici une mini vidéo en anglais sur la définition d'objectifs "SMART":

<https://youtu.be/1-SvuFIQjK8>


Si nécessaire, vous pouvez réduire vos ambitions avec le projet, afin de vous concentrer sur ce qui aura le plus d'impact.

C'est ce que l'on appelle travailler en méthode agile, avec une évolution progressive du périmètre fonctionnel en se concentrant sur le besoin du client (la fonction minimale attendue), et pas sur le produit fini avec toutes les options.

Le but est de créer le plus rapidement possible un prototype (ou MVP) afin de valider sur le terrain que ce qui a été réalisé correspond bien à la demande, et si nécessaire faire les corrections.

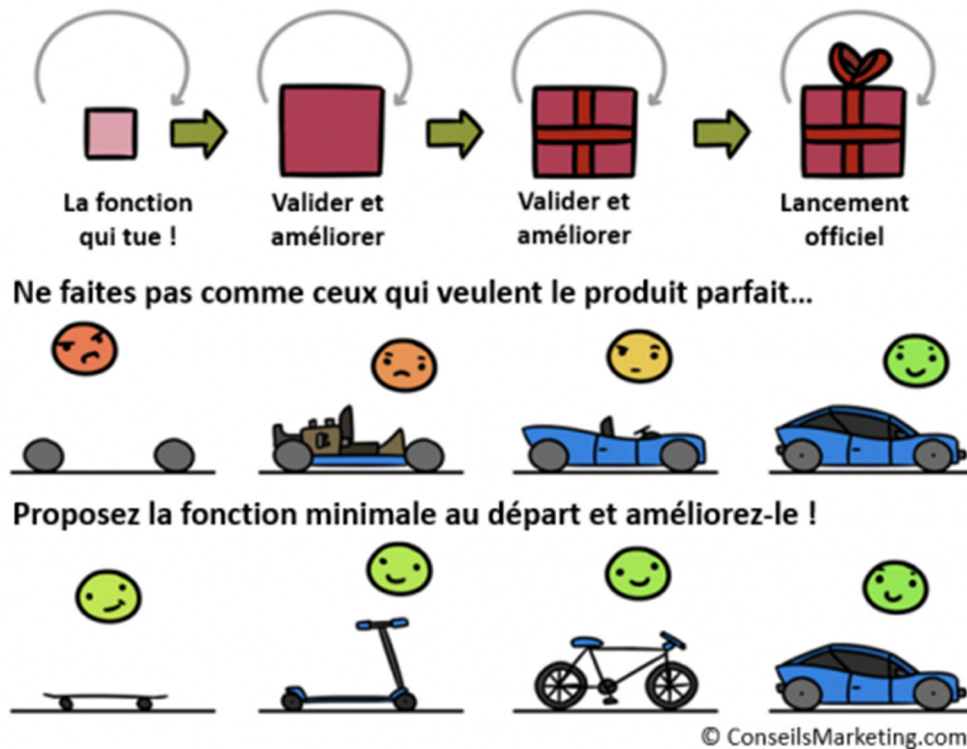

Pour cela, il est préférable de travailler sur des cas d'usage (ou users stories ou besoins client), et de les faire tester rapidement.

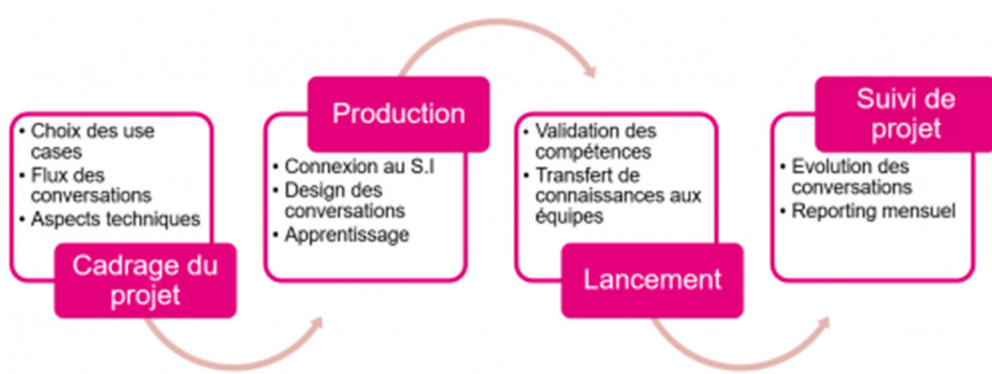


A noter :

- **Dans un projet complexe ou nouveau ou long, il est important de faire une analyse des risques.** Une analyse des risques consiste à lister dans un document Word ou Powerpoint ou dans votre logiciel de gestion de projets tout ce qui pourrait

mal se passer, et de lister les actions correctrices, réductrices ou d'évitements. Cette analyse comprend le problème, l'impact possible sur le projet, la probabilité que cela arrive, la solution. Par exemple dans un projet, vous vous pouvez travailler avec une startup, avec un risque que la société fasse faillite d'ici à la fin du projet, et donc l'action d'évitement peut être de vérifier la santé financière de l'entreprise ou de vous assurer que vous puissiez travailler avec un autre fournisseur. L'analyse de risque n'oblige pas à traiter tous les risques, mais surtout à éviter les problèmes en les anticipant.

- **Evitez de gérer plusieurs tâches en même temps, planifiez des durées longues pour traiter une action** (ex: 2 heures, 4 heures...) dans votre agenda. Ne faites surtout pas de multiples points de 1 heure. Ce qui fonctionne le mieux est d'être concentré sur une action et de la finaliser, plutôt que de revenir dessus plusieurs fois. De même, une personne qui peut officiellement travailler 8 heures / jour, n'a le plus souvent en réalité que 6 heures par jour pour gérer un projet (les 2 heures étant pour gérer des urgences, répondre à des emails et chat, faire du reporting...). Pour éviter les conflits, les burnouts... faites toujours des points en 1 to 1 avec les personnes en charge des tâches clés, et demandez leurs si la durée est correcte, s'il ne faut pas un peu plus de temps... Le plus souvent une personne va sous-estimer la durée des actions, et pour cela faites un point sur les dernières actions avec l'estimé et le réalisé, et si l'écart est trop important, alors ré-évaluez les tâches qui restent à faire.

1.3 Définir l'enchaînement logique des tâches et les chantiers principaux

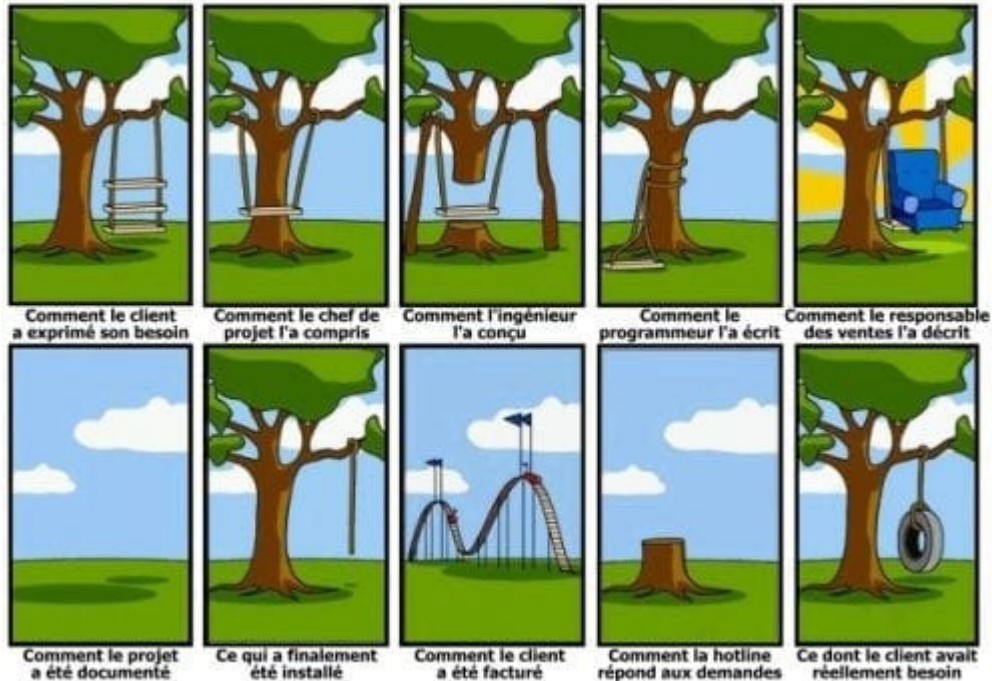

Tout ne doit pas se faire en même temps, et il est essentiel de commencer des chantiers immédiatement alors que d'autres peuvent attendre.

Par exemple, vous pouvez organiser une réunion de lancement de projets avec les parties prenantes bien avant d'avoir tous les éléments en main.

En anticipant cela, vous allez déjà avancer sur le projet (et ne pas subir des indisponibilités), mais en plus vous allez vous fixer une première date pour avancer sur le projet.

Il faut donc distinguer :

- **Les chantiers**, c'est à dire le regroupement de tâches d'une même thématique (ex: il peut y avoir un chantier back-end, un chantier front-end, un chantier réseau...).
- **Les tâches ou actions**, c'est à dire ce qui doit être fait pour faire avancer ou finir le projet.

Plus vous découperez les tâches en petites actions, plus fine et précise sera votre gestion de projet.

En effet, une action qui peut paraître simple peut être composée de X petites tâches, qui présentent des risques, des délais...

Par exemple, la mise à disposition d'un serveur sur le Cloud pour installer un logiciel peut nécessiter de :

- Faire la demande au service informatique
- Faire une réunion avec les équipes techniques pour préciser la demande
- Faire la commande auprès du fournisseur
- Tester l'environnement
- Valider que l'application installée convient
- ...

La granularité d'une tâche peut être de 4 heures (1/2 journée), à 1 journée. Ce n'est pas nécessaire d'aller en dessous de 2h. De toute manière, on prend toujours une petite marge.

Lors de ces réunions préalables, vous devez définir la matrice des responsabilités (le RACI).

Cette matrice permet de lister sur les lignes les actions à mener, et dans les colonnes les personnes du projet.

Pour chaque action, il faut indiquer qui est

- **R**esponsable de la tâche, c'est à dire ceux qui font l'action en question.
- **A**pprobateur, c'est à dire celui qui valide le travail effectué
- **C**onsulté, c'est celui qui aide à la réalisation de la tâche
- **I**nformé, les personnes qui sont informés de la réalisation et la finalisation de l'action.

Voici un exemple simplifié :

Areas of focus are the activities, deliverables, departments, or channels in the content process. These vary based on the content RACI type.

	ROLES				
Area of focus	Writer(s)	Translator(s)	Editor	Subject matter experts	Producer
Write content	R	C	C	C	A
Translate content	C	R	C	I	A
Content accuracy	R	R	C	A	I
Content completeness	R	R	A	C	I
Content quality	R	R	C	I	A
Tone and voice	R	R	C	I	A
Digital standards	R	R	C	I	A
Final approval	C	C	C	C	A/R

Roles vary depending on the content process. One person can have several roles.

The grid identifies the type of responsibility assigned to each role.

R Responsible
The people who actually do the work. One or more people can be responsible.

A Accountable
The Approver. The person who signs off on the work. Usually, only one person is accountable.

C Consulted
The subject matter experts who are consulted and sometimes contribute to creating content.

I Informed
The people who are informed when a deliverable is complete. Communication only goes one way.

A noter : si vous travaillez avec un client, des prestataires... listez bien les responsabilités de chacun Parfois certaines personnes pensent que ce n'est pas de leur responsabilité, alors que vous pouvez penser l'inverse.

1.3.1 Prédécesseurs et successeurs, l'enchaînement des actions

Maintenant que vous avez établi la liste des tâches, il faut les “relier” entre elles, les ordonner.

C'est-à-dire qu'il faut définir, pour chaque tâche, toutes les tâches *prédécesseur*, c'est-à-dire toutes les tâches qu'il faut réaliser en amont, avant de pouvoir réaliser une tâche donnée : ça s'appelle l'ordonnancement.

Petit point de vocabulaire : si on appelle *prédécesseur* la tâche amont, on appelle *successeur* la tâche aval.

Par exemple, pour un projet “réaliser un gâteau”, la tâche acheter les ingrédients sera prédécesseur de préparer le gâteau : eh oui, vous ne pouvez pas le préparer tant que vous n'avez pas les ingrédients nécessaires (inversement, préparer le gâteau sera successeur d'acheter les ingrédients) !

Vous pourriez me dire, quel est l'intérêt de lister ces tâches ?

Cela va vous permettre de paralléliser les actions, sinon vous allez vous retrouver dans la situation suivante :

- Vous avancez sur un sujet
- Vous rencontrez une difficulté ou un imprévu
- Vous résolvez le problème
- Vous faites les tests pour vérifier que tout se passe bien
- Vous arrivez à une nouvelle action, vous détectez un autre problème
- Vous lancez une étude pour trouver une solution
- Vous testez la solution et vous validez
- Vous continuez, et vous trouvez un autre problème inconnu alors
- ...

Au final vous allez passer de problème en ayant l'impression de n'avoir rien anticipé, et vous allez prendre des semaines de retard sur de gros projets.

C'est pourquoi, il faut certes avoir un focus sur 1 chantier prioritaire, mais surtout anticiper les autres pour ne pas les traiter à la suite.

L'anticipation est la clé de la réussite d'un projet, et cela évite les montagnes russes émotionnelles et les mauvaises surprises de dernière minute.

1.3.2 Les types de liaisons

On appelle liaison ou dépendance ou lien de dépendance le lien qui unit un prédécesseur à un successeur.

D'ailleurs, à ce propos, il existe 4 types de liaisons :

- FD (fin à début),
- FF (fin à fin),
- DD (début à début),
- DF (début à fin).

Définissez également les délais entre les tâches.

- **FD – Fin-à-Début** : La tâche B ne peut pas commencer tant que la tâche A n'est pas terminée.
 - C'est le type de liaisons le plus courant.
 - Représente environ 95% des liaisons entre deux tâches.
 - Par exemple, la diffusion du rapport ne peut pas commencer tant que la rédaction du rapport n'est pas terminée.
- **FF – Fin-à-Fin** : La tâche B ne peut pas terminer tant que la tâche A n'est pas terminée.
 - La tâche B se termine à tout moment une fois que la tâche A est elle-même terminée, et elle n'est pas obligée de terminer en même temps.
 - Par exemple, le contrôle des installations électriques d'un chantier ne peut pas terminer tant que toutes les installations n'ont pas été achevées.
 - Dans ce cas, la tâche B est menée au fur et à mesure que les installations sont réalisées : on n'a pas besoin d'attendre que toutes les installations soient réalisées pour commencer le contrôle de la 1ère installation.
- **DD – Début-à-Début** : La tâche B ne peut pas commencer tant que la tâche A n'a pas commencé.
 - Petite précision : la tâche B peut commencer à tout moment une fois que la tâche A a commencé, elle n'est pas obligée de commencer en même temps.
 - Par exemple, la rédaction du rapport ne peut pas commencer tant que la création du plan détaillé du rapport n'a pas commencé.
- **DF – Début-à-Fin** : La tâche B ne peut pas terminer tant que la tâche A n'a pas commencé.
 - C'est le type de liaison le plus rare.
 - Par exemple, vous ne pouvez pas terminer l'assemblage des toits d'un lotissement tant que la charpente n'a pas commencé.

1.4 Ajouter la durée et les contraintes des tâches et ajouter des tâches externes



Tout le monde se réserve toujours des marges de sécurité pour réaliser des actions.

Les actions du chef de projet sont donc de :

- Bien formaliser les demandes aux parties prenantes
- Faire une relance avant la date de livraison des livrables (et si nécessaire recalculer une date)
- Trouver des leviers (relationnels, hiérarchique, budgétaires, organisationnels...) pour faire avancer les dossiers
- Caler des dates (réunions, remises de documents...) acceptés par les participants (en leur demandant leurs avis, et si nécessaire de voir ce qui est livré ou compris pour réduire les délais ou les coûts).

1.4.1 Durées ou charge de travail

A présent, cela va dépendre selon que vous travaillez avec Microsoft Project (très complexe et cher) ou un autre logiciel de gestion de projet comme vous pourrez le voir dans la suite de ce dossier.

A partir de cette charge de travail et de la disponibilité des ressources, on obtiendra une durée finale.

La durée est donc une **sortie** du logiciel (par exemple, la rédaction d'un rapport qui ne prendrait que 3h de travail combiné à une disponibilité de 30min par jour pendant 6 jours). Bref, charge de travail ou durée, ce n'est pas vraiment la même chose.

1.4.2 Les Contraintes

Certaines tâches ont des contraintes de dates.

C'est le moment de les spécifier. Par exemple, la déclaration d'impôt possède une contrainte de **fin au plus tard le 30 juin**. Cette tâche possède donc une contrainte de type "fin au plus tard" qui a pour valeur 30 juin.

Si cette contrainte n'est pas respectée, votre projet "impôts" risque d'avoir des problèmes. Il existe également d'autres contraintes :

- début au plus tôt
- début au plus tard
- doit commencer le
- doit finir le
- fin au plus tôt
- fin au plus tard

1.4.3 Les Tâches externes

Votre projet dépend également de tâches externes.

Dans ce cas-là , vous pouvez soit choisir de les ajouter directement en tant que tâche standard, soit les ajouter uniquement sous forme de "jalon", c'est-à-dire une tâche de durée zéro, un simple point à valider avant de pouvoir passer à la suite.

C'est vous qui voyez.

1.5 Définir et attribuer les ressources



Sur un projet, vous êtes la ressource principale pour organiser, et souvent faire les choses.

Attention cependant à ne pas faire à la place des autres : non seulement vous risquez de faire moins vite et moins bien, mais en plus en cas de problème vous pourriez être tenu comme responsable...

Faites donc bien attention à apprendre à déléguer, et à être assertif (c'est à dire demander sans imposer).

1.5.1 Dresser la liste des ressources

Ici, le problème est simple : vous devez purement et simplement dresser la liste des ressources.

N'oubliez pas le matériel : les ressources n'impliquent pas seulement l'humain.

→ Voir la matrice de compétences pour les ressources humaines.

1.5.2 Définir les contraintes pour les ressources

Chaque ressource aura des contraintes de disponibilité ou de charge maximale qui lui seront propres.

N'oubliez donc pas de définir leur nombre d'heures disponibles par jour, leurs jours de repos (et à l'inverse leurs jours de travail si elles sont disponibles pendant les week-ends) ainsi que la part de leur temps qu'elles pourront consacrer au maximum sur une tâche.

Par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui travaillera tous les jours, même le week-end, mais qui ne sera disponible que 2 heures par jour, et qui ne pourra passer que la moitié de son temps sur une tâche.

1.5.3 Affecter les ressources

Une fois que vous avez votre liste des ressources, vous pouvez les affecter à vos tâches.

N'oubliez pas de préciser à ce moment-là le Reste-à-Faire.

Le Reste-à-Faire dépend des ressources ET des tâches, ce n'est pas une simple charge de travail par tâche divisible entre les ressources.

1.6 Planifier et assurer le suivi du projet



1.6.1 Planifier

A présent, il ne vous reste plus qu'à planifier le projet.

Cela va vous permettre ensuite de comparer le prévisionnel et le réel, pour voir où vous avez pêché, et ainsi vous améliorer de manière continue.

Il y a des fonctionnalités prévues dans les logiciels de gestion de projet (voir la fin de ce dossier).

Attention : **il est rare qu'un projet complexe ou nouveau respecte les délais, le budget...** Par exemple en informatique, il est quasi obligatoire de prévoir 25% de temps en plus, et 10% de dépassement de budget. Ce temps et ce budget en plus doivent être validés en amont avec votre manager (et bien entendu non révélés à l'équipe ou au prestataire). C'est votre marge de négociation, et cela vous évitera d'aller quémander une rallonge de budget à la dernière minute.

1.6.2 Assurer un bon suivi

Ici démarre la gestion de projet à proprement parler.

Ce que nous avons fait jusqu'à présent relevait plutôt du management de projet, étant donné que vous avez participé à la définition des tâches et des objectifs.

Le point principal est de faire vivre votre planning et de le réviser au jour le jour : de cette manière, vous comprendrez en direct ce qu'un changement au niveau d'une tâche implique quant à la date de fin du projet, et vous pourrez prendre les mesures de rattrapage nécessaires.

Insistons : le planning doit vivre au rythme du projet, sinon il ne sert plus à rien.

Idéalement, vous devez aussi avoir un espace partagé qui centralise l'information pour tous (voir les logiciels de gestion de projets).

Cela vous permet par exemple de dire "Oui, tu as l'information sur l'espace projet..." au lieu de perdre des heures à montrer à tout le monde où se trouve l'information...

Planifiez-vous surtout des réunions personnelles dans votre agenda afin de relancer les personnes... Vous verrez que souvent, même les personnes avec la meilleure volonté, n'obéissent qu'aux personnes qui "crient" le plus fort ou qui les relancent souvent.

Une petite astuce est de passer au bureau des personnes juste pour dire bonjour, faire un coucou... cela permet de physiquement ne pas oublier que les participants doivent vous rendre des éléments ! Un petit coup de pression est souvent bon 😊

A noter : ne considérez une tâche finalisée que lorsqu'elle l'est à 100%. Parfois on estime que c'est finalisé à 95%... mais un petit problème arrive et on prend un délai supplémentaire. Donc prenez soin de vous assurer de la finalité complète.

1.6.3 Clôture du projet

C'est une phase souvent négligée, c'est d'indiquer la fin du projet.

Souvent la fin de projet est souvent liée à la mise en place de celui-ci, mais il est conseillé de faire 2 événements séparés :

- Un lancement officiel du projet qui sera le point de départ pour les utilisateurs
- Une clôture de projet qui sera une fête pour les participants au projet (ou en tout cas un moment de félicitations)

1.7 Faire un retour d'expérience post projet (le REX)



Le Retour d'EXpérience (ou REX) permet de faire une analyse "post mortem" de son projet avec ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché...

Le but est de réunir les principaux acteurs du projet plusieurs semaines après la fin du projet, afin d'avoir un retour "à froid", c'est à dire une fois le projet mis en place.

Le REX permet de ne plus refaire les mêmes erreurs pour les prochains projets, et souvent de récompenser les participants au projet.

2. Les principaux logiciels de gestion de projets

Pour automatiser la gestion de vos projets, vous pouvez utiliser des logiciels de gestion de projets.

Pour un projet ultra simple (ex : organiser un salon, un web séminaire...), un document Word de référence et/ou un fichier Excel partagé suffisent.

Pour un petit projet dans une PME, une Startup, pour une mission de Freelance... Monday.com, Wrike ou Asana suffisent largement.

Pour un projet plus complexe dans une grande entreprise des logiciels comme MS Project... sont généralement plus adaptés.

Pour le développement d'un logiciel, d'un produit... en mode agile, Trello est généralement bien adapté.

En complément, utilisez des logiciels de communication (chat + visio conférence...) comme Slack, Teams... afin d'avoir rapidement des réponses et garder un historique des échanges (groupés ou individuels).

2.1 Les logiciels de gestion de projets simples pour des petits projets




Ces logiciels de gestion de projets sont très simples à mettre en place, puisqu'ils sont accessibles par exemple depuis le Cloud, et il suffit d'ouvrir un compte d'essai pour commencer à les utiliser.

Ces outils de gestion de projets sont très simples et très visuels, et permettent d'avoir un suivi des tâches, une vision de l'avancement... sans y passer des heures.

- **Monday.com** : Monday est un logiciel très visuel et très simple. Il permet de partager simplement des agendas, activités... entre les parties prenantes d'un projet. Il offre aussi des outils d'automatisation (si on reçoit un email de telle personne alors...).
- **Wrike** : est un logiciel de gestion de projets complet, avec une gestion des tâches liées aux projets, avec la gestion des images, vidéos...
- **Asana** : ce logiciel de gestion de projets en ligne est très complet, avec une gestion pointue des tâches, avec en particulier des Gantt... C'est un logiciel pour les entreprises plus structurées.

2.2 La gestion de projets simples avec Trello.com




Trello.com n'est pas vraiment un logiciel de gestion de projets, mais c'est un outil qui permet d'appliquer facilement une gestion de projets agile.

En effet, en gestion de projet agile, le but est de détailler des features, des stories... et le système des "cartes" trello avec une liste de tâches à réaliser (le backlog), les actions en cours... permettent de suivre facilement un projet de manière graphique.


Trello est un outil de gestion de tâches plutôt qu'un vrai outil de gestion de projets (ex: pas de Gantt, pas de gestion des temps...), mais il permet de gérer projets très simplement et visuellement, en particulier ceux qui utilisent la méthode agile.

Pour utiliser correctement Trello, vous pouvez utiliser le site ou installer les plugins Chrome suivants :


- Card Color Titles for Trello



- Scrum for Trello

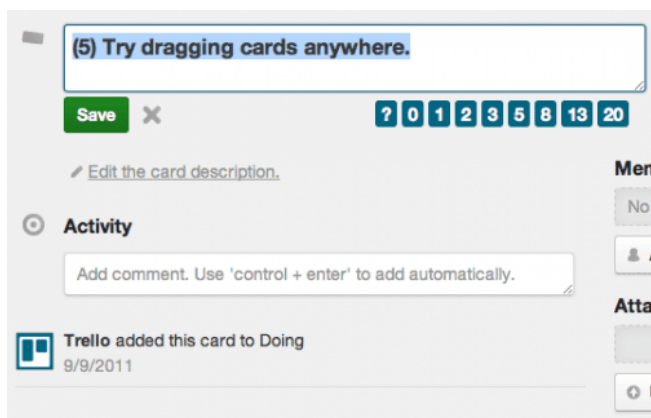


- Stylish – Thèmes personnalisés pour sites Web
- Trello Card Numbers

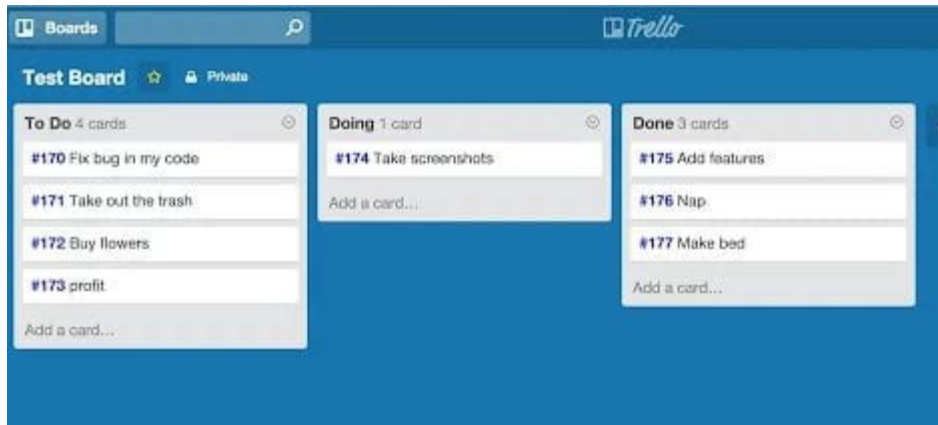

- Ultimello, the features pack for Trello



Et voici le résultat :

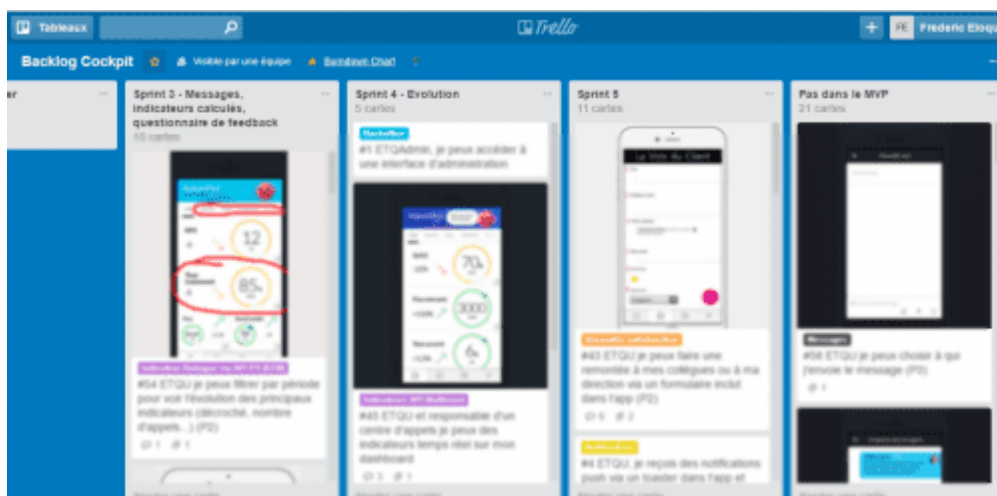


2.3 Les logiciels de gestion de projets pour les projets complexes



Les logiciels pour gérer des projets complexes dans les grandes entreprises ou dans le cadre de projets complexes (ex : mise en place d'un progiciel, construction d'une machine...), permettent d'avoir un meilleur suivi des tâches, des ressources, de gérer des intervenants...

Ce sont des logiciels de gestion de projets bien plus complets, mais ils nécessitent un gros effort pour la mise à jour, le suivi...

- **MS Project:** le plus complet, mais aussi le plus complexe... à réserver aux gros projets très structurés avec gestion du temps passé, du coût...

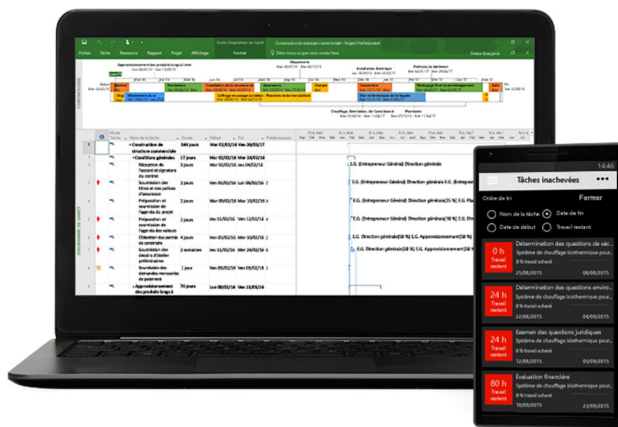

- <http://www.redmine.org/> : c'est un logiciel de gestion de Projets Open Source. Il est assez rustique, mais il est gratuit.
- **BaseCampHQ.com** : c'est un des leaders mondiaux de gestion de projets. Il est simple et facile à utiliser.

3. Quelques conseils pour bien gérer un projet

Bien gérer un projet nécessite avant tout d'être rigoureux, d'anticiper, de noter et de gérer les relations humaines.

En effet, un projet nécessite à la fois de prendre en compte des éléments rationnels (les étapes, les ressources...), mais aussi la dimension humaines (tout particulièrement si les personnes chargées des actions sont des collègues et non pas vos subordonnés).



Voici quelques conseils simples :

- **Préparez toujours un support (Powerpoint) pour les réunions (même si ce ne sont que 2 ou 3 slides)**
 - Le fait d'avoir un support permet de montrer que la réunion a été préparée, et donc que le projet est suivi.
 - Une astuce consiste à utiliser le support Powerpoint pour prendre des notes en séances, et d'ensuite partager le document aux participants, avec un résumé des actions dans l'email de compte rendu de réunion. Ensuite vous pourrez reprendre le Powerpoint de la réunion passée en le copiant pour créer le support de la réunion en cours.
- **Préparez le support de vos réunions de suivi toujours 1 jour avant la réunion.**
 - Cela vous permet d'envoyer un email à vos collègues, aux personnes responsables des actions... afin de les relancer avant la réunion (et ainsi leur laisser le temps d'avancer sur les sujets).
- **Envoyez toujours vous-même le rendez-vous, plutôt que de laisser une autre personne le faire.**
 - En effet, c'est la personne qui fait le compte rendu qui maîtrisera ce qui doit être fait ou pas.
 - Ainsi vous pourrez toujours reprendre un compte rendu pour indiquer ce qui devait être fait, les délais...
- **Lorsqu'une décision est prise, demandez toujours en séance qui le fait, et la date qu'il estime pouvoir finaliser cette action.**
 - Cela permet de caler une date (et de ne pas attendre).
 - C'est aussi un moyen pour vous de laisser un peu de mou dans le projet, par exemple en accordant quelques jours de plus à une personne afin de ne pas mettre une pression trop forte sur le timing.

- **Accélérez le rythme des réunions pour accélérer un projet.**
 - Souvent le rythme d'un projet, c'est une réunion par semaine. Cependant, lorsque vous êtes en phase de finalisation, il est important de programmer 2 réunions par semaine pour impulser un rythme plus important, et surtout éviter que les actions ne s'étalent de trop.
 - Les réunions quotidiennes sont à réserver aux projets qui partent en vrille, l'objectif étant de marquer à la culotte les personnes impliquées dans le retard en leur demandant des comptes sur les actions quotidiennes.
- **Mettez en place un canal de communication par chat (ex: un groupe WhatsApp, un channel Teams...) afin de pouvoir échanger en temps réel sur des questions simples**
 - Cela permet de mettre tout le monde au même niveau et d'avoir rapidement des réponses sans des échanges d'emails.
- **Faites des réunions physiques d'un minimum de 3 heures avec les acteurs clés du projet** (ex: le chef de projet + les développeurs + les testeurs) afin de corriger en direct les bugs.
 - En étant côte à côte vous pouvez expliquer plus efficacement les problèmes, trouver les solutions et les tester.
 - Cela n'a rien à voir en termes d'efficacité par rapport à des échanges d'emails ou des réunions à distance.
- **Maintenez une date limite pour mettre en place le projet, cela oblige les personnes à se caler sur cette date.**
 - En effet, si vous repoussez sans cesse la date de livraison, les acteurs du projet vont se dire qu'ils ont encore du temps, ou alors prendre plus de temps pour réaliser leurs actions...
 - Si vous maintenez la date prévue, quitte à la décaler 3 jours avant, toute l'équipe se sera mise en ordre de bataille et aura fait de son mieux pour le meilleur rapport qualité / prix.

4. Les méthodes de gestion projet les plus connues




4.1 Liste non-exhaustives de 25 possibilités

- **Agile**
- Adaptative Project Framework (APF)
- Critical Chain Project Management (**CCPM**)
- *Critical Path Method (CPM)*
- Crystal Clear
- Feature Driven Development (FDD)
- Diagramme de Gantt
- Ivy Lee
- **Kanban**
- **Lean**
- Program Evaluation and Review Technique (PERT)
- *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)*
- Pomodoro
- **Prince 2**
- PProjects integrating Sustainable Methods (PRiSM)
- Rational Unified Process (RUP)
- Scaled Agile Framework (SAFe)
- **Scrum**
- Scrumban
- **Six Sigma**
- Objectifs Smart
- Les 2 listes de Warren Buffet
- **Waterfall**
- Work Breakdown Structure (WBS)
- **eXtreme Programming (XP)**

En gras, quelques méthodes que nous allons détaillés.

4.2 Quelques méthodes en détails

Nous allons ici, vous détailler les méthodes choisies ci-dessus avec une proposition de circuit vous permettant de faire un choix.

Méthodes	Schéma
Waterfall Concept : processus linéaire au sein duquel les activités s'enchaînent en ordre séquentiel Candidats idéaux : les équipes qui cherchent à clarifier les étapes et les dépendances des tâches	
Prince 2 Concept : méthode employée dans la gestion de qualité, pour éliminer les irrégularités de projet Candidats idéaux : les grandes équipes qui gèrent des projets complexes	
Lean Concept : système destiné à éviter tout gaspillage et créer un cadre de travail simple pour tous les besoins du projet Candidats idéaux : les équipes qui rencontrent des problèmes d'efficacité	
Scrum Concept : "sprints" courts, que l'on utilise pour former un cycle de projet Candidats idéaux : les équipes qui comptent diviser pour mieux régner, grâce à une approche en plusieurs étapes	

Kanban

Concept : représentation des backlogs de projet à l'aide d'éléments visuels, comme des tableaux


Candidats idéaux : les équipes qui préfèrent visualiser leurs activités



Six Sigma

Concept : méthode employée dans la gestion de la qualité, pour éliminer les irrégularités de projet

Candidats idéaux : les grandes organisations qui souhaitent limiter les erreurs



Chaine critique

Concept : processus incluant le suivi des tâches, qui relie les activités aux objectifs


Candidats idéaux : les équipes qui cherchent à résoudre leurs problèmes d'efficacité




EXtreme Programming

Concept : fonctionnement basé sur la création de cycles de développement courts, impliquant de nombreuses versions

Candidats idéaux : les équipes de taille réduite à moyenne qui exercent des délais serrés



4.3 Choisir la méthodologie de votre projet

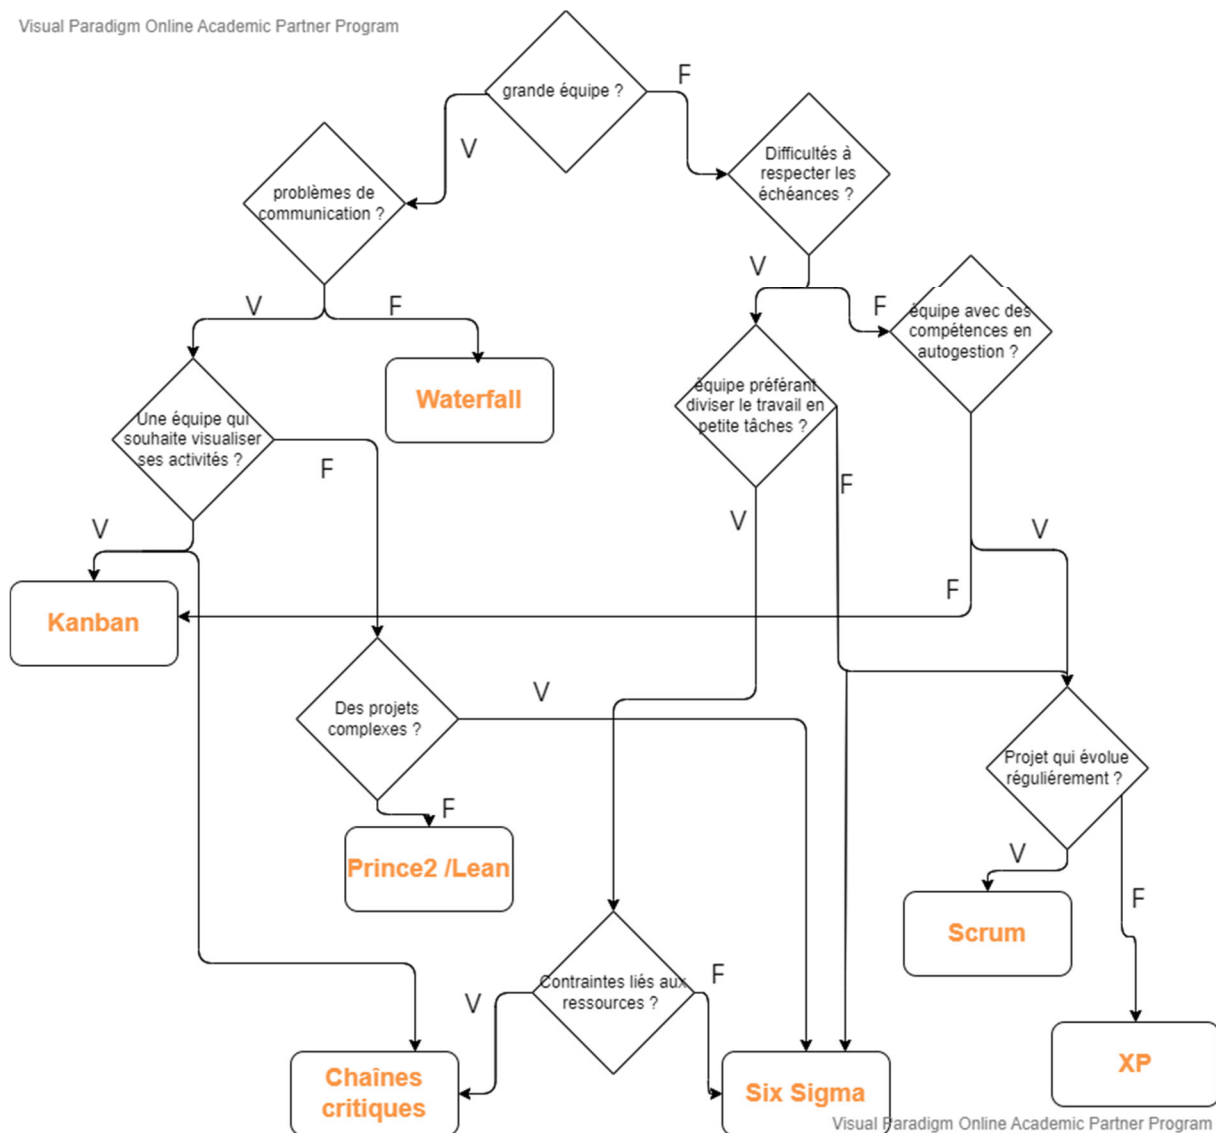

4.4 Explication de ce qu'est une méthode de gestion de projet

La gestion de projet est un domaine en constante évolution et un certain nombre d'approches sont à envisager pour assurer sa réussite.

Une méthodologie de gestion de projet est un système qui regroupe des principes, techniques et procédures utilisés par les individus qui travaillent dans une même discipline. Les principales méthodologies diffèrent non seulement par leur structure (selon les caractéristiques des organisations qui les appliquent), mais aussi par la nature des livrables, processus, outils (diagramme de Gantt, PERT) et même par le logiciel de gestion de projet adopté.

4.4.1 C'est quoi, la gestion de projet ?

La gestion de projet est l'acte de planifier, organiser et de gérer un projet afin d'atteindre un objectif ou un résultat prédéfini. Toutes les entreprises mettent en place des projets pour atteindre leurs objectifs à court et à long terme.

4.4.2 Quelle méthodologie choisir pour piloter vos projets ?

S'agissant de la gestion de projet, il n'existe pas d'approche universelle. Chaque méthodologie repose sur des principes uniques qui vous aident à mener à bien vos projets, de la planification à l'exécution finale en passant par la gestion des ressources humaines.

La taille de votre équipe et la façon dont elle souhaite travailler constituent deux aspects clés à ne pas négliger. Voici quelques points supplémentaires dont il faut tenir compte :

- **Votre secteur d'activité** : demandez-vous si vous travaillez dans un secteur qui évolue fréquemment (les entreprises technologiques appartiennent à un secteur en constante évolution, par exemple, dans notre cas donc un critère fort courant). Votre secteur d'activité influe sur la cohérence du projet et vous devez pouvoir déterminer s'il est préférable d'opter pour une méthodologie flexible ou constante.
- **L'orientation de votre projet** : songez aux objectifs de votre projet. Accordez-vous davantage d'importance aux individus qu'à la productivité ? Vous pourrez ainsi déterminer la méthodologie qui correspond le mieux à vos objectifs.
- **La complexité des projets** : en général, vos projets sont-ils plutôt complexes ou simples ? Les méthodes ne sont pas toutes aussi efficaces s'agissant de l'organisation de tâches complexes (c'est le cas de la CCPM).
- **Le niveau de spécialisation des rôles** : vos collègues exercent-ils des fonctions spécifiques ou possèdent-ils un savoir-faire particulier ? Est-il envisageable de faire travailler plusieurs membres de l'équipe en alternance sur le même type de tâche ou avez-vous besoin d'une méthodologie qui prend en compte le niveau de spécialisation de chacun ?
- **La taille de votre organisation** : la taille de votre structure et celle de votre équipe doivent être prises en compte au moment de choisir une méthodologie. Certaines conviennent aux équipes de toutes tailles (comme Kanban), tandis que d'autres sont davantage adaptées aux petites équipes (chemin critique).

4.5 Explications brèves de quelques méthodes de gestion de projet

4.5.1 Agile, la gestion de projet itérative

Concept : la méthodologie Agile est l'un des processus de management de projet les plus courants. Et pour être tout à fait exact, il s'agit d'un principe même de la gestion de projet.

La méthode Agile :

- Encourage la collaboration
- S'avère rapide à mettre en œuvre et efficace

- Suit un processus itératif et fondé sur les données
- Valorise les individus plutôt que les processus


Dans le cadre d'une approche Agile, il n'est pas rare que les équipes décident de combiner plusieurs méthodologies de gestion de projet (Scrum, Kanban, Extreme programming, Crystal ou Scrumban).

Pour qui ? La méthode Agile convient à toutes les équipes ou presque. En effet, le principe qui le sous-tend est plutôt universel.

4.5.2 Le Waterfall

Concept : le modèle en cascade ou « Waterfall » est également très populaire. Mais contrairement à l'approche Agile, Waterfall constitue bel et bien une méthodologie, plutôt simple à mettre en œuvre. Cette méthodologie Waterfall est un processus linéaire dans lequel les activités s'enchaînent en ordre séquentiel (d'où l'image de la chute d'eau).

Dans cette approche, les tâches sont reliées les unes aux autres par une dépendance. Chaque tâche doit être terminée avant de pouvoir en commencer une autre. Vous vous assurez ainsi que le travail reste en bonne voie et vous encouragez une communication claire tout au long du processus.

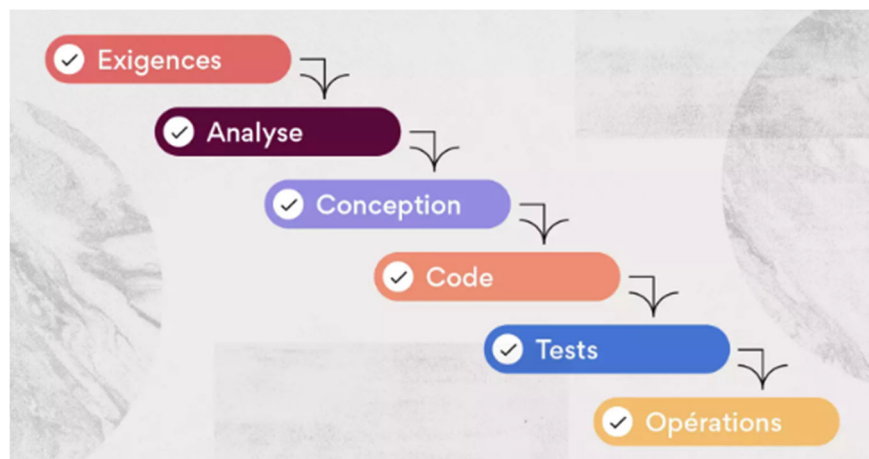

Bien que considérée comme une approche plus traditionnelle par certaines organisations modernes, cette méthode permet de créer un plan de projet transparent et planifié au millimètre.

Pour qui ? En raison de son caractère très détaillé, la méthodologie de projet Waterfall est idéale pour travailler sur des projets de grande envergure qui comportent de nombreuses parties prenantes.

4.5.3 Scrum

Concept : la méthode de gestion de projet Scrum repose sur des « sprints » courts, que l'on utilise pour former un cycle de projet. Ces derniers s'étendent sur une à deux semaines et sont gérés par des équipes de 10 personnes maximum. Les tâches

individuelles ne sont donc pas dépendantes les unes des autres, comme dans le modèle en cascade.

L'approche Scrum est unique pour de nombreuses raisons, notamment car elle suppose l'intervention d'un Scrum Master. En d'autres termes, un chef de projet qui dirige les réunions quotidiennes, les démonstrations et les sprints, mais également les rétrospectives de sprints, une fois ces derniers terminés.

Si Scrum est bel et bien une méthodologie de projet à part entière, elle est le plus souvent associée à une approche Agile. Ces deux modèles présentent des principes similaires, notamment la collaboration et la valorisation des individus par rapport aux processus.

Pour qui : les équipes qui optent pour une approche Agile devraient également miser sur Scrum. En outre, les différents sprints sont gérés par de petites équipes, cette approche peut donc convenir aux équipes de toute taille.

4.5.4 Le management de projet Kanban

Concept : la méthodologie de projet Kanban est une représentation des backlogs de projet à l'aide de tableaux. Cette approche est utilisée par les équipes Agile pour mieux visualiser les processus et l'état d'avancement des projets. Le plus souvent, vous appliquerez la méthode Kanban par le biais d'une application logicielle, laquelle vous permettra de modifier et faire glisser des tableaux au sein des projets en toute transparence. Mais ce n'est pas la seule option possible.

Le concept principal à retenir, c'est que la méthodologie Kanban aide les équipes à se concentrer sur ses tâches les plus importantes, en s'appuyant sur une structure simple.

Pour qui ? Les tableaux Kanban constituent des outils de gestion de projet parfaits pour les équipes de toutes tailles, et plus particulièrement pour celles qui travaillent à distance. En effet, ils offrent aux membres de votre équipe le moyen de visualiser le travail en cours pour garder le cap sur leurs projets.

4.5.5 La gestion de projet Scrumban

Concept : vous l'aurez sans doute deviné, Scrumban est une méthodologie qui s'inspire des approches de gestion de projet Scrum et Kanban.

Scrumban s'appuie sur un cycle de sprints comparable à celui de la méthode Scrum, tout en vous permettant d'ajouter des tâches individuelles à votre planning, comme dans la méthodologie Kanban. Vous pouvez ainsi accomplir les activités essentielles et concevoir des plans de projet simples. Scrumban prévoit également l'organisation de réunions Scrum pour renforcer la collaboration et garder le cap sur les objectifs.

Pour qui ? Si l'idée de décomposer un projet en tâches plus petites vous plaît, mais que vous souhaitez conserver un visuel simple, le modèle Scrumban est sans aucun doute fait pour vous. Il offre un juste équilibre entre simplicité et clarté.

4.5.6 PRINCE2

Concept : PRINCE2 est l'abréviation de « P ROjects IN Controlled Environments » (projets en environnements contrôlés). Cette approche permet de définir les étapes d'un projet en s'inspirant majoritairement de la méthodologie Waterfall. PRINCE2 a été conçue par le gouvernement britannique afin de gérer ses projets informatiques. Aujourd'hui encore, cette approche convient davantage aux initiatives informatiques de grande ampleur qu'aux projets traditionnels axés sur les produits ou le marché.

Avec la méthodologie PRINCE2, la gestion de projet se divise en sept étapes :

1. Élaborer le projet
2. Diriger le projet
3. Initialiser le projet
4. Contrôler le projet
5. Gérer la livraison du produit
6. Gérer une limite de séquence
7. Clore le projet

Ces sept étapes constituent un processus complet et permettent une gestion de projet sous contrôle. En outre, PRINCE2 permet de rationaliser bon nombre de tâches individuelles : contrôler une séquence, gérer la livraison d'un produit, lancer ou clôturer un projet, etc.

Pour qui ? L'approche PRINCE2 convient davantage aux grands projets d'entreprise qui impliquent un certain nombre de parties prenantes. Dans le cadre de petits projets, y recourir risque d'allonger et de complexifier inutilement votre processus de gestion.

4.5.7 Six Sigma

Concept : Contrairement aux autres méthodologies de gestion de projet, Six Sigma est employé dans le cadre de la gestion de la qualité. Bien souvent, elle est combinée avec Lean ou Agile, et il est donc courant de parler de Six Sigma Lean ou Six Sigma Agile.

L'objectif principal de la méthode Six Sigma est d'améliorer les processus en continu et d'éliminer les irrégularités de projet.

Pour passer à la vitesse supérieure, n'hésitez pas à employer la méthode Six Sigma DMAIC qui s'apparente à un processus, décomposé en plusieurs phases :

- Définir : déterminez la portée du projet, rédigez un business case et organisez une réunion debout de lancement.

- Mesurer : recueillez des données qui vous aideront à déterminer les améliorations nécessaires.
- Analyser : identifiez les causes profondes des problèmes rencontrés.
- Améliorer : tâchez de résoudre les problèmes soulevés.
- Contrôler : travaillez à la pérennisation des solutions trouvées, pour vos projets à venir.

Pour qui ? La méthode Six Sigma convient davantage aux grandes organisations. Dans des structures à grande échelle, limiter les irrégularités de projet s'avère indispensable, afin d'éviter toute répercussion négative pour l'entreprise.

4.5.8 La méthode du chemin critique (Critical Path Method ou CPM)

Concept : cette méthode permet d'identifier et de planifier les tâches critiques d'un projet. Ceci inclut la création de dépendances de tâches, le suivi des objectifs et de l'état d'avancement du projet, la hiérarchisation des livrables et la gestion des échéances. Autant d'éléments que l'on retrouve dans le principe de l'organigramme des tâches.

L'objectif de cette méthodologie ? Gérer correctement des projets à grande échelle et les accomplir avec brio, en veillant à ce que jalons et livrables soient correctement cartographiés.

Pour qui ? La méthode du chemin critique est idéale pour les projets et équipes de taille réduite à moyenne. En effet, les projets de grande envergure impliquent le rendu de nombreux livrables et intègrent de multiples parties prenantes. Or, cette méthode n'est pas adaptée à la gestion des projets complexes.

4.5.9 La méthode de la chaîne critique (Critical chain project management ou CCPM)

Concept : dans le cadre de la gestion de projet, la méthode de la chaîne critique est étroitement liée à celle du chemin critique. Toute la différence réside dans le niveau de détails, beaucoup plus important dans l'approche de la chaîne critique, une méthode qui compte donc parmi les plus exhaustives.

Cette approche améliore la productivité et l'efficacité des équipes, et fait le lien entre les tâches à accomplir et les objectifs du projet. Bon nombre d'outils de gestion de projet incluent même des éléments visuels qui facilitent la visualisation des objectifs, ce qui permet aux membres d'équipe de bénéficier d'une feuille de route structurée.

Pour qui ? La méthode de la chaîne critique convient aux équipes de toutes tailles, mais permet avant tout de résoudre les problèmes d'efficacité à l'échelle des projets.

4.5.10 La gestion de projet Lean

Concept : la méthodologie de gestion de projet Lean est un système destiné à éviter tout gaspillage et créer un cadre de travail simple pour tous les besoins de projet. L'objectif est d'accomplir davantage avec moins d'efforts pour optimiser travail d'équipe et productivité.

Si réduire les pertes de temps présentait autrefois un avantage dans le cadre de la création d'un bien matériel, cette idée vise aujourd'hui à éliminer les irrégularités de projet ou le « gaspillage ». Il existe 3 « maux » ou « ennemis » de la gestion Lean, regroupés fréquemment sous l'appellation « 3M » :

- Muda (gaspillage) : pratiques qui mobilisent des ressources, mais n'apportent aucune valeur ajoutée.
- Mura (irrégularités) : certaines situations accaparent les ressources et les obligent à travailler dans l'urgence, ce qui entraîne donc des déséquilibres.
- Muri (surmenage) : lorsque les ressources sont trop sollicitées.

En tant que chef de projet, votre mission consiste à tenir à distance ces 3 M afin de gagner en efficacité dans l'exécution des projets et de simplifier les processus. La méthodologie Lean est similaire au processus unifié rationnel, également appelé méthode RUP (Rational Unified Process), qui vise également à réduire gaspillage et irrégularités. Cela étant, la méthode RUP vise plutôt à limiter les coûts de développement.

Pour qui ? L'approche Lean vise à optimiser la gestion et l'exécution des projets, et s'avère donc particulièrement adaptée aux équipes qui rencontrent des problèmes d'efficacité. Si cette approche a des effets plus visibles lorsqu'elle est employée dans de grandes entreprises, elle sera tout aussi utile aux équipes projet de toutes tailles.

4.5.11 Le guide PMBOK® du Project Management Institute(PMI) sur la gestion de projet

Concept : si le Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) du PMI est considéré comme une méthodologie de gestion de projet, il s'agit plus exactement d'un ensemble de bonnes pratiques qui prennent en compte divers processus de développement.

Cette structure se concentre sur la mise en œuvre des cinq phases de la gestion de projet, lesquelles permettent de gérer aisément un projet de A à Z selon une approche structurée en 5 phases que voici :

- Démarrage du projet
- Planification du projet
- Mise en œuvre du projet
- Suivi de l'efficacité
- Clôture du projet

Le guide PMBOK® est un bon point de départ sur lequel s'appuyer, mais ce modèle n'est pas toujours aussi précis que d'autres approches similaires. En effet, vous devrez décider des tâches à accomplir lors de chacune des phases.

Pour qui ? Le Guide PMBOK® peut être utilisé seul (sans faire appel à d'autres méthodes en parallèle) par les petites équipes pour gérer des projets standard.

4.5.12 L'eXtreme Programming (XP)

Concept : comme son nom l'indique, l'eXtreme Programming est utilisé pour gérer des projets au rythme soutenu et avec des délais serrés. Cette approche repose sur des cycles de développement courts avec de nombreuses versions. Cela permet aux équipes de travailler rapidement et de gagner en productivité.


L'eXtreme Programming repose sur plusieurs valeurs fondamentales, notamment la simplicité, la communication, le retour d'information, le respect et le courage. Cette méthode comprend également un ensemble spécifique de règles XP, lesquelles couvrent toutes les phases, de la planification aux tests.

Pour qui ? Il est possible de recourir à l'eXtreme Programming dans le cadre de projets individuels gérés par des équipes de taille réduite à moyenne qui exercent dans des délais serrés.

5 Le Cycle en V

Le cycle en V est une méthode de gestion de projet linéaire utilisée principalement pour le développement de logiciels. Chaque phase de conception est accompagnée d'une phase de test. Bien que ce modèle soit déjà un peu ancien, il s'agit d'une méthode idéale pour les projets simples et de petite taille.

Découlant du modèle en cascade, la méthode cycle en V est un incontournable de la gestion de projet. Utilisé plus particulièrement dans le domaine informatique et le développement de logiciels, le cycle en V implique toutes les phases de mise en œuvre d'un projet, à travers neuf grandes étapes.

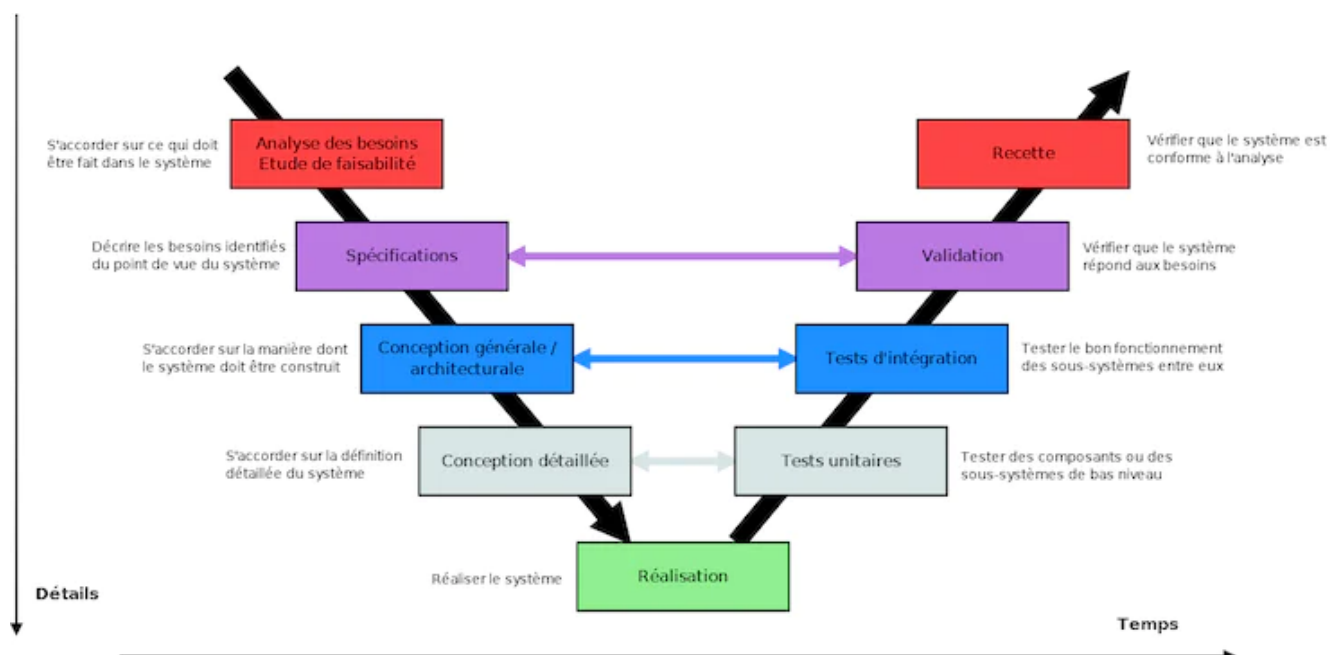

5.1 Qu'est-ce que le cycle en V ?

Le cycle en V en gestion de projet se sert d'un processus linéaire divisé en phases bien définies. L'idée du cycle en V est apparue pour la première fois dans les années 1970. À l'époque, cette méthode de gestion de projet fut développée pour remplacer le modèle en cascade (waterfall) utilisé jusqu'alors.

Le cycle en V pour les projets informatiques a véritablement été utilisé dans les années 1990. Depuis, le modèle a été ajusté à plusieurs reprises et adapté au monde actuel. En fait, il s'agit d'une succession de phases se déroulant de manière linéaire. La différence avec le modèle en cascade réside dans le fait que, dans un cycle en V, une phase de validation est menée parallèlement à toutes les étapes. On peut se représenter le tout comme un V. Il y a pour ainsi dire deux lignes qui se rejoignent en une pointe. Sur le côté gauche du V, les exigences sont décrites, c'est la phase descendante. On passe grossièrement des exigences du système à l'architecture spécifique et aux composants. Sur le côté droit, parallèlement à chacune de ces étapes, se déroule un test nécessaire à la validation. Il peut s'agir d'un test système, d'un test d'intégration ou d'un test de composant. A la pointe du V, au point de rencontre des deux lignes, le système est mis en œuvre.

5.2 Quelles sont les étapes de la méthode cycle en V?

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, il existe en tout trois phases différentes de développement du système, ces phases correspondant au cycle de vie du projet. Globalement, elles vont de l'analyse des besoins aux tests d'acceptation.

- Phase de conception : les exigences sont définies grossièrement et présentées de manière de plus en plus spécifique. Ces étapes de conception forment le côté gauche du cycle en V.
- Mise en œuvre : figurant à la pointe du cycle en V, le produit est développé pendant la mise en œuvre.
- Phase de validation : ici, on remonte le côté droit du V selon le principe bottom-up. Ainsi, on effectue d'abord des tests unitaires de composants, puis des tests d'intégration et enfin des tests d'acceptation. Ainsi, chacune des étapes de la phase de conception est testée.

5.3 La phase de conception

Commençons par la phase de conception. Ici, la conception du logiciel est définie et divisée en plusieurs niveaux qui deviennent de plus en plus spécifiques. Les domaines suivants sont importants :

5.3.1 Analyse des besoins du clients

La première phase consiste à collecter le plus d'informations possible. Cette partie est très décisive, car les analyses et les conceptions ultérieures dépendent de cette étape. C'est justement pour cette raison que les équipes projet investissent souvent beaucoup de temps dans cette analyse.

C'est ici que des choses fondamentales sont définies : quelles sont les spécifications fonctionnelles ? Quand le logiciel doit-il être prêt ? Cela permet également de concevoir un premier plan de projet et le cahier des charges.

5.3.2 Conception du système

Comme dans le modèle en cascade, l'étape suivante est la conception du système. C'est ici que sont développées les bases de la manière dont le logiciel doit être mis en œuvre et sur quelles informations le système s'appuie. On crée ainsi un design pour l'ensemble du système. Un organigramme pour les tâches et les responsabilités respectives serait ici très utile.

5.3.3 Conception générale ou architecturale

L'étape suivante est la conception architecturale qui consiste à diviser le système global en ses différents composants. C'est ce qu'on appelle la phase de conception de bas niveau. On décrit ici les dépendances et les interfaces des différents

composants afin de créer une image globale plus détaillée du logiciel et de ses spécifications techniques.

5.3.4 Spécification des composants

La dernière étape de la phase de conception consiste à définir les détails fondamentaux des composants. Tous les détails et spécifications concernant les composants respectifs sont consignés en détail, y compris les composants backend ou les tables de base de données.

Avec la fin de la spécification des composants, vous avez, en tant que chef de projet, terminé la première étape du cycle en V.

Vous disposez maintenant d'une feuille de route ainsi que d'une description générale et détaillée du logiciel, des différents composants et de leurs dépendances ou interfaces.

5.4 La mise en œuvre

Vous arrivez ainsi à l'étape suivante du modèle en V dans la gestion de projet, le processus de développement logiciel proprement dit. Dans cette phase, on travaille réellement sur le logiciel. Les différents composants et le logiciel sont maintenant mis en œuvre comme cela a été défini lors de la phase de conception. Différents outils et méthodes peuvent être utilisés pour finaliser le logiciel.

5.5 La phase de validation

Dans la dernière phase du modèle en V, différentes phases de test sont réalisées pour les différentes phases de développement. Il y a donc quatre tests de validation pour les quatre étapes partielles de la phase de conception. Selon le principe bottom-up, on commence par la spécification des composants et on termine par l'analyse des exigences.

5.5.1 Test des composants

Comme leur nom l'indique, les tests unitaires de composants examinent les différents composants et leurs caractéristiques. Il s'agit de déterminer si les caractéristiques ont été mises en œuvre dans le logiciel comme indiqué dans les spécifications.

Il s'agit entre autres de vérifier si la sortie souhaitée est obtenue avec un certain input. Il est extrêmement important que les composants soient contrôlés de manière isolée. Il se peut en effet que des erreurs surviennent parce que les interfaces ou les dépendances ont été mal mises en œuvre. En somme, il s'agit de vérifier le bon fonctionnement de chaque composant.

Si les composants individuels fonctionnent correctement, le test des composants est considéré comme terminé.

5.5.2 Test d'intégration

Comme nous l'avons déjà mentionné, cette étape permet de vérifier si l'interaction entre les différentes fonctions est correct. Il s'agit ici de voir comment les groupes de composants ou les parties du logiciel collaborent et fonctionnent entre eux.

Si toutes les interfaces et dépendances des composants fonctionnent, ce test est également considéré comme terminé.

5.5.3 Test du système

Dans cette étape, l'ensemble du logiciel est testé. Toutes les fonctionnalités discutées sont testées, et l'on vérifie en même temps si les fonctionnalités fonctionnent exactement avec les entrées et les sorties définies lors de la phase de conception du système.

C'est au plus tard à ce stade qu'il serait judicieux d'impliquer les clients dans la phase de test. Ceux-ci peuvent déjà tester le système dans les grandes lignes et voir si des non-spécialistes du développement logiciel peuvent s'en sortir avec le système.

5.5.4 Test d'acceptation

Le dernier test du cycle en V est le test d'acceptation. Ici, le logiciel est testé dans un environnement qui, dans l'idéal, correspond exactement à l'environnement final. On y fait participer des personnes qui correspondent exactement aux futurs utilisateurs finaux.

Cela permet de déterminer si le système ne fonctionne pas seulement correctement, mais aussi s'il est accepté.

Une fois ce test terminé, le développement du logiciel du modèle en V est considéré comme terminé. Le système fonctionne alors exactement comme convenu lors de la phase de conception et il est accepté par les clients comme ils le souhaitent.

6 Les to do list

6.1 C'est quoi, une to do list ?

La définition d'une to do list est simple. Il s'agit d'une liste de tâches que vous devez accomplir ou de choses que vous voulez faire. Le plus souvent, ces tâches sont organisées par ordre de priorité. Vous pouvez utiliser ce type de check-list à la maison, dans votre vie personnelle ou sur votre lieu de travail.

Le fait d'avoir une liste de tout ce que vous devez faire écrite permet de ne rien oublier d'important. En classant les tâches de la liste par ordre de priorité, vous planifiez l'ordre dans lequel vous allez les faire et vous pouvez voir rapidement ce qui nécessite votre attention immédiate et les tâches que vous pouvez remettre à plus tard.

6.2 Quelle application pour une to do list ?

Si ce n'est pas déjà fait, la première étape consiste à créer une to do list sur une application professionnelle. Établir une liste sur papier (ou post-it !) peut sembler motivant, car vous avez le loisir de rayer chaque activité accomplie. Toutefois, ce n'est pas un bon moyen de suivre vos tâches. Dans les faits, il faut bien avouer que les check-lists manuscrites sont peu organisées, faciles à égarer, peu efficaces et sources d'erreurs.

Ne prenez pas de risques et utilisez dès maintenant une application professionnelle. Contrairement aux listes manuscrites, ces applications de gestion de tâches ont l'avantage de vous permettre de :

- Trier et hiérarchiser les tâches. Envie de réorganiser vos tâches ? Aïe ! Si votre liste est manuscrite, vous devez tout réécrire... En revanche, sur une application de listes de tâches, rien de plus simple : modifiez l'ordre de vos tâches par simple glisser-déposer. En outre, la plupart des applications de ce type vous permettent d'attribuer des étiquettes personnalisées, idéales pour suivre la priorité des tâches.
- Garder une trace des tâches enregistrées. Contrairement à une liste rédigée sur une feuille volante, impossible de perdre une to do list en ligne. Vous pouvez également y accéder et la compléter à tout moment, où que vous soyez.
- Ajouter du contexte. La plupart des applications professionnelles permettent d'ajouter des informations plus détaillées dans la description des tâches. Sur une to do list manuscrite, vous êtes obligés de décrire les activités sur lesquelles vous travaillez en quelques mots. Une application en ligne vous permet d'ajouter une description à chaque tâche, sans limite. Il est aussi possible de joindre des informations utiles, des documents de travail ou autres détails importants.
- Créer plusieurs listes au même endroit. Au moment de choisir une application, assurez-vous qu'elle vous permet de créer plusieurs listes de tâches. Vous

pourriez en créer une première pour votre travail personnel, une deuxième pour les activités de votre équipe et une troisième pour votre formation professionnelle. Une application qui vous laisse la possibilité de créer plusieurs listes de tâches est idéale pour centraliser l'ensemble des activités à accomplir.

- Définir des échéances, des rappels et envoyer des notifications. Si vous ne tenez pas vos délais, votre to do list n'a pas vraiment d'utilité. Une application en ligne vous permet de suivre la progression de vos activités et de configurer des rappels ou d'envoyer des notifications pour ne pas oublier d'effectuer vos tâches dans les délais impartis.
- Simplifier la collaboration. La to do list individuelle organisée et des priorités claires vous permettent de mieux vous concentrer sur les projets et initiatives d'équipe. Autrement dit, plus vous êtes organisés, plus la collaboration d'équipe sera simple.

6.3 Comment faire une to do list efficace ? 15 conseils pour vous faciliter la vie

Prêt à optimiser votre to do list ? Nous vous confions tous nos secrets : suivez ces astuces pour travailler efficacement et en toute clarté. Notez que pour la plupart, nous supposons que vous utilisez déjà une application pour organiser votre travail et gagner en productivité.

6.3.1 Prendre note de toutes ses idées

Mieux vaut commencer une tâche et jeter quelques idées à la volée, quitte à terminer le travail plus tard, au risque d'oublier ce que vous vouliez accomplir au départ. Bien souvent, certaines de nos meilleures idées nous viennent quand nous ne sommes pas en mesure d'en prendre note. L'inspiration n'attend pas : vous avez une proposition à faire pour améliorer un projet ou une idée géniale à présenter à votre patron ? Ajoutez-la simplement à votre to do list.

C'est aussi la raison pour laquelle il est essentiel de choisir une application mobile de qualité. Si vous êtes en déplacement, vous pourrez noter vos idées sans avoir besoin de les garder en tête jusqu'à pouvoir accéder à votre ordinateur.

6.3.2 Classez ses listes

Si les listes de choses sont souvent si longues, c'est entre autres parce qu'elles finissent généralement par se transformer en véritable pot-pourri. Vous travaillez sur plusieurs projets à la fois et vous avez programmé un rappel pour un rendez-vous ou la révision de votre prochain brief de campagne... Il ne s'agit que d'un exemple, mais vous avouerez que la confusion est telle qu'il y a de quoi se sentir totalement débordé.

Pour gérer votre to do list d'une main de maître et travailler efficacement, n'hésitez pas à créer plusieurs listes. Pour commencer, assurez-vous que chaque projet ou

initiative importante dispose de sa propre liste. En outre, pensez à créer une liste pour les activités qu'il est possible d'accomplir sans délai, une autre pour vos idées à propos de projets et une troisième pour vos rappels personnels.

Selon votre priorité du moment, il vous suffit d'accéder à la liste correspondante pour identifier clairement les tâches à accomplir.

6.3.3 Organiser la to do list par processus, priorité ou échéance

Réorganiser votre to do list quotidiennement est une perte de temps, même si cela peut parfois sembler motivant. Résistez à cette tentation et prenez le temps de structurer vos tâches de manière cohérente. Si votre application le permet, envisagez de créer des sections pour les différents types d'activités : vous pourrez trier les tâches par projet ou par date butoir, selon vos préférences.

My Tasks		
Task name	Due date	Projects
High Priority		
✓ Prepare demo for sales on-site	Today	Pre-Sales Deal Support
✓ Review new client contract	Today	Sales Pipeline
Medium Priority		
📄 [Approval required] Discount for 2-year contrac	Today	Contracts & legal
✓ Customer discovery call RECAP	Tomorrow	Pre-Sales Deal Support
✓ Set personal revenue targets 2 🗨	Dec 15 – 17	Sales Planning
Low Priority		
✓ Review buyer personas (Q4 UPDATE)	Nov 25 – Dec 17	Sales Planning
✓ Create customer-specific sales deck	Dec 15 – 17	Pre-Sales Deal Support

6.3.4 Rendre la to do list exploitable

Votre to do list n'est pas l'endroit idéal pour annoter et conserver vos idées ou objectifs. Ces informations doivent bel et bien être prises en compte, mais si vous conservez toutes ces données au sein d'une même liste, vos tâches importantes risquent de se perdre dans la masse. Pour garder le contrôle, essayez plutôt de regrouper idées et objectifs sur un outil de gestion de projet ou d'utiliser un système de gestion des objectifs.

C'est un bon moyen d'accéder en tout temps à vos réflexions spontanées et objectifs clés, sans surcharger votre to do list.

6.3.5 Commencer ses tâches par un verbe d'action

S'assurer que chaque tâche est exploitable est une chose, mais nous vous conseillons aussi d'attribuer un titre à chacune de vos tâches en commençant par un verbe d'action. Il ne s'agit pas d'une règle absolue, cependant commencer par un verbe vous aidera à déterminer précisément de quoi il est question.

Prenons un exemple : une tâche dont le titre est "Trois images publicitaires pour Facebook" vous est attribuée. Êtes-vous en mesure de comprendre ce que l'on attend de vous ? Non.

Ajoutez le verbe « Concevoir » en début de titre et tout s'éclaire. La tâche est désormais concrète et exploitable : "Concevoir trois images publicitaires pour Facebook".

Les listes de tâches dont le titre commence par un verbe d'action permettent d'identifier en un clin d'œil le travail demandé.

6.3.6 Hiérarchiser ses tâches

Pour vous assurer d'accomplir le travail nécessaire à temps, vous devez impérativement réussir à identifier les tâches à traiter en priorité. Vous placez vos tâches les plus importantes en tête de liste ? Vous préférez utiliser des étiquettes personnalisées pour indiquer la priorité de chaque tâche ? Ce choix vous appartient, mais dans les deux cas, veillez bien à bénéficier à tout moment d'une visibilité parfaite sur vos activités clés, afin de ne rien oublier.

Pour autant, rien ne vous oblige à accomplir les tâches les plus importantes en premier. Parfois, exécuter une tâche simple de bon matin est la meilleure façon de bien commencer la journée. En outre, vous faites peut-être partie des adeptes de la « loi des 80-20 » (ou « loi de Pareto »), principe qui revient à consacrer 20 % de votre temps pour accomplir 80 % de vos tâches, donc à traiter les tâches rapides avant les autres.

6.3.7 Définir systématiquement une échéance

Au moment de passer à l'action, mieux vaut être conscient des tâches à accomplir, mais vous devez aussi être au clair sur les délais d'exécution. Si vous terminez l'ensemble de vos tâches importantes, mais que la moitié sont rendues en retard, le travail produit n'est pas efficace. Vous devez donc toujours savoir qui fait quoi et pour quand.

Quand bien même les échéances ne seraient pas clairement définies, pensez toujours à noter les dates de rendu provisoires, quitte à les modifier plus tard.

6.3.8 Décomposer les projets en tâches plus petites

Exécuter sa to do list en temps voulu pose certaines difficultés et prend parfois des allures de défi, comme une montagne à gravir. Qui n'a jamais été pris d'une vague de découragement en jetant un œil aux tâches prévues pour le lendemain et en constatant qu'il y avait « du pain sur la planche » ?

Vous vous retrouvez souvent dans ce genre de situations ? Dans ce cas, pensez à diviser le travail en sous-tâches. Par exemple, l'échéance de la tâche parente (ou principale) est fixée en fin de semaine, mais l'activité à accomplir demande un travail conséquent qui prendra plusieurs jours. Pour assurer la réussite de votre projet, il est donc essentiel de diviser le travail en tâches plus petites que vous pouvez réaliser tout au long de la semaine.

6.3.9 Regrouper les tâches similaires

Regrouper vos tâches vous aide à atteindre vos objectifs et vous fait également gagner en productivité. Chaque fois que vous basculez entre différentes tâches ou que vous commencez un nouveau projet, votre cerveau a besoin d'un peu de temps pour s'adapter et s'ajuster aux nouvelles attentes.

Pour commencer, identifiez parmi vos tâches quotidiennes celles que vous pouvez regrouper et simplifier. Vous effectuez sans doute certaines activités quotidiennement, sans penser au temps que vous y consacrez. Toutefois, au bout du compte, ce temps s'accumule et n'est pas négligeable. Nous vous conseillons de noter le temps réellement passé sur ces tâches, puis de réfléchir aux mesures que vous pourriez prendre pour optimiser leur exécution.

Est-il possible de les regrouper ou les automatiser ? Ce gain de temps vous permettra de mettre de l'ordre dans votre to do list et d'être plus productif.

6.3.10 Célébrer chaque étape accomplie

Chaque tâche terminée sur votre liste est une petite victoire. Félicitations ! Toute réussite doit être célébrée : pas besoin d'en faire des tonnes, un petit signe suffit.

6.3.11 Trier sa liste en fin de journée

Lassé de consacrer la moitié de votre matinée à passer votre to do list au peigne fin ? Organisez vos tâches la veille en fin de journée, et identifiez précisément ce qui vous attend le lendemain. Prenez cinq à dix minutes chaque soir et triez votre liste pour commencer la journée suivante du bon pied.

6.3.12 Désactiver les notifications

Les notifications sont un atout considérable pour produire un travail efficace, et toute bonne application de to do list a toujours des notifications utiles à vous envoyer. Toutefois, vous devez aussi disposer de fonctionnalités comme la « mise en veille/sourdine » ou le mode « Ne pas déranger ».

Votre but reste en effet de bien organiser votre travail et de gagner en productivité. Or, pour ce faire, vous avez besoin de vous concentrer, et non d'être distrait toutes les cinq minutes par la réception d'une notification.

6.3.13 Apprendre à suivre l'essentiel avant tout

Personne n'aime perdre son temps sur des tâches superflues. Vouloir regrouper un maximum de données dans votre to do list est louable, mais il faut parfois savoir faire une sélection pour garantir un suivi optimal.

Si vous suivez vos priorités, vous êtes déjà en mesure d'identifier l'importance de chacune de vos tâches. Si nécessaire, n'hésitez pas à ajuster ces priorités. Pour suivre vos tâches, vous n'avez pas à respecter chaque jour à la lettre un programme prédéfini, mais bien à garder le contrôle de vos tâches en suivant vos activités clés, selon l'évolution des priorités.

6.3.14 Surveiller tout retard éventuel et en comprendre l'origine

Il nous est déjà arrivé à tous (ou presque) d'avoir manqué de temps et laissé en suspens des tâches dues la semaine précédente... La prochaine fois, interrogez-vous sur les raisons de ce retard. Quelle est l'origine de ce manque de temps ? Avez-vous besoin d'ajuster les échéances de certaines tâches ou de les réattribuer à un collègue ? Y a-t-il des points que vous ne comprenez pas et que vous souhaitez clarifier avant de vous mettre au travail ?

Identifier les raisons de votre retard vous aidera à travailler plus efficacement et à vous remettre sur la bonne voie.

6.3.15 Collaborer sur une seule et même plateforme

Le suivi de vos tâches doit avoir une finalité concrète. Inutile de tout organiser et de définir des priorités si vous manquez de visibilité sur le travail de votre équipe, et vice versa. Les équipes les plus efficaces sont celles qui disposent d'une source unique de référence afin de regrouper tous les projets traités. Les membres de l'équipe savent qui est responsable de quoi, chacun peut donner le meilleur de soi-même et contribuer à la réussite de l'équipe.

7 Présentation du QQQQCP

7.1 Définition

La méthode prendrait origine 20 siècles en arrière, sous l'Empire Romain en l'hexamètre dit de Quintilien. Sa version anglaise est connue sous le nom des "5 W's" - Who dit What ? Where, When and Why ?. Son nom français "QQQQCP" vient de l'acronyme qui la définit :

- **Q - Quoi** : objet, action, phase, opération.
- **Q - Qui** : parties prenantes, acteurs, responsables.
- **O - Où** : lieu, distance, étape.
- **Q - Quand** : moment, planning, durée, fréquence.
- **C - Comment** : matériel, équipement, moyens nécessaires, manières, modalités, procédures.
- **P - Pourquoi** : motivations, motifs, raisons d'être, etc.

Le questionnement peut se voir attribuer un axe supplémentaire important : le "Combien ?" (coûts, quantité...). La méthode prend alors l'acronyme QQQQC C P. Par ailleurs, le dernier P - Pourquoi peut s'étendre à Pour Quoi : dans quel objectif ?

La démarche consiste à récolter et analyser toutes les informations pertinentes disponibles en posant un maximum de questions de tous ordres quant à une problématique, une situation, un sujet défini préalablement. L'idée est de réfléchir de manière constructive afin de faire ressortir les causes principales du problème, les raisons d'être d'un projet spécifique , définir les grandes lignes d'un plan d'action, etc.

7.2 Objectif de la démarche

Cet outil permet d'explorer un thème sous toutes ses coutures et trouver des solutions adaptées. Il permet en outre de trier un ensemble d'informations pertinentes et les classer selon suivant cette logique : du "quoi" (description de la situation en question) au "Pourquoi".

7.3 Avantages et limites de la méthode

L'un des avantages du QQQQCP est sa simplicité, tant dans son implémentation que dans son utilisation concrète. Par ailleurs, c'est une méthode qui incite à un questionnement large et constructif. Elle permet de recueillir des informations essentielles et précises quant à une situation donnée.

Parmi ses limites, on peut noter le caractère "perturbant" ou contre-productif que peuvent revêtir certaines questions si elles sont mal formulées.

7.4 Contexte d'utilisation de la démarche

En termes d'application, la méthode QQOCQP est fort utile pour l'analyse, la cartographie et définition des processus cibles en parallèle de la méthode Ishikawa (diagramme causes à effets) plus centrée sur la résolution des dysfonctionnements organisationnels. Elle peut ainsi être utilisée, entre autres, dans le cadre de :

- **Résolution de problèmes**
- **Définition d'un plan d'action**
- **Élaboration d'un projet**
- **Rédaction d'un compte-rendu de réunion**
- **Management des hommes** , notamment dans le cadre de la gestion des conflits
- **Prospection**

Méthode QQOCQP



7.5 Le QQOCQP dans le détail

7.5.1 Qui ?

Il s'agit de déterminer qui sont les différents protagonistes impliqués. Cette question peut "viser" les personnes, les postes, les services, les compétences, le type d'acteurs impliqués (collaborateurs, clients, fournisseurs, prestataires divers, etc.). Ainsi, les questions à poser sont, entre autres, les suivantes :

- Qui a relevé le problème ? Qui a initié le questionnaire ?
- Qui est responsable du projet, du dossier ?
- Qui est à l'origine du problème ?
- Qui est directement concerné ?
- Qui est impacté ?
- Qui a besoin de réponses ?
- Qui contacter ?

Il peut être judicieux de nuancer ses propos en formulant ces questions de manière moins intrusive et plus diplomatique : Quelle est la personne qui a relevé le problème ? Quelle est sa fonction ? Quels sont les services, équipes concerné(e)s ? ...

7.5.2 Quoi ?

Cette question sert à définir de manière claire et précise la problématique en question, se focaliser sur le projet à implémenter, etc. L'idée est de déterminer la nature du problème ainsi que ses conséquences, mieux définir les différentes facettes d'un projet, etc. Ainsi, le questionnaire pourra être :

- De quoi s'agit-il précisément ?
- Quelle est la situation actuelle ?
- Quelles sont les conséquences ?
- Quels sont les risques ?
- Qu'est-ce qui a été mis en place pour tenter de régler le problème ?
- Quels sont les retours ?
- Qu'est-ce qui a fonctionné ? À l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas répondu aux attentes initiales ?

7.5.3 Où ?

Il s'agit à travers cette question de décrire les lieux et situer précisément les choses dans l'espace. Les interrogations se porteront sur :

- Où se situe le problème ? Dans quel pays, bâtiment, service, équipe, etc. ? Sur quel produit ? Quelle machine ? Quel poste ? etc.
- À quelle étape la difficulté apparaît-elle ?
- L'endroit où se situe le problème est-il accessible ?

7.5.4 Quand ?

Vient ensuite la question de la temporalité. L'objectif étant de déterminer les circonstances temporelles - fréquence, durée, prévisibilité, etc. - du problème. Le questionnement s'articule alors autour d'interrogations telles :

- Quand a eu lieu le problème précisément ?
- Depuis combien de temps ce souci se présente-t-il ?
- À la suite de quel événement particulier ?
- La difficulté se produit-elle régulièrement ? Si oui, à quelle fréquence ?
- À quel moment le problème apparaît-il ?

7.5.5 Comment ?

Il s'agit de définir la façon dont le problème survient, mais aussi comment les acteurs agissent et avec quels moyens (ce point peut être détaché et faire l'objet d'un questionnement spécifique) :

- Comment se manifeste le problème ?
- Comment les différents protagonistes réagissent-ils ?
- Quelles procédures sont mises en place, suivies ? Quelles sont les consignes ?
- Comment le règlement régit-il ce type de situation ?
- Quelles méthodes sont utilisées ?
- Comment l'entreprise, le service, l'équipe s'organise-t-elle ?

7.5.6 Combien ?

Souvent incluse dans le point précédent, cette question vise à quantifier les moyens - humains, financiers, techniques, temporels, etc. - mis en place et/ou nécessaires face à ladite situation. Se posent alors des questions de type :

- De combien de temps dispose-t-on pour résoudre le problème ?
- De quel budget dispose-t-on ?
- Combien de machines, outils, postes, services, etc. sont concernés ?
- Combien de prestataires pouvons-nous consulter ?
- Combien coûte le défaut à l'entreprise ?

7.5.7 Pourquoi ?

La dernière facette du questionnement s'intéresse aux causes, aux racines, mais également à l'objectif visé. Pour chacune des questions précédentes et pour que la critique soit constructive, il peut être opportun d'analyser les raisons et utilités, buts quant aux différents éléments identifiés .

7.5.8 Tableau

En annexe, un fichier excel permettant de mieux organiser votre travail.

8 La matrice de compétences

La matrice de compétences permet d'avoir sous forme de tableau une vision d'ensemble sur le niveau de compétences fonctionnelles ou techniques d'un ensemble de ressources par exemple humaines.

Elle est parfois mise en place et gérée par le manager d'un service qui s'en sert pour gérer les personnes de son équipe, et savoir quel profil recruter en cas d'absence prolongée ou de départ d'une personne de son équipe.

Ce tableau permet aussi de déterminer des binômes de travail qui ont un profil proche pour que l'un puisse remplacer l'autre en cas de congés de l'un ou de l'autre.

Concrètement, il s'agit d'un tableau qui liste en ligne des compétences et en colonne des noms de ressources et qui au croisement donne un numéro correspondant au degré de maîtrise de cette compétence par cette ressource.

Ce tableau permet de gérer aussi plus facilement le nécessaire remplacement d'une ressource car on saura en un coup d'œil quel profil rechercher.

Si on voit un chiffre faible de maîtrise pour toutes les ressources pour une tâche donnée, il sera alors plus facile d'envisager le besoin de formation.

L'application de la matrice de compétences à la gestion de projet nécessite d'établir préalablement la correspondance entre les tâches du projet et les compétences requises.

Ensuite, en fonction de la matrice de compétences, on pourra alors faire correspondre les bonnes ressources aux bonnes tâches.

Il est alors aussi facile d'identifier des compétences manquantes au sein de l'équipe projet et donc des besoins en formation ou bien en nouvelle(s) ressource(s).

8.1 A quel moment la matrice de compétences est-elle utile ?

Dans le cadre de votre processus de planification projet, une fois que vous avez listé toutes les tâches principales et les sous-tâches liées aux tâches principales de votre projet, vous devez aller dans un niveau de détail suffisant pour ne pas passer à côté d'une tâche.

En effet, cette dernière risquerait d'être oubliée et aurait eu de l'importance pour le projet.

Puis une fois que vous avez su évaluer la durée de chacune de ces tâches et sous-tâches et que vous avez su voir lesquelles étaient dépendantes des autres et lesquelles pouvaient se faire en parallèle en même temps, il est temps ensuite d'affecter des personnes à chacune de ces tâches.

8.2 Les étapes

- Étape 1 : Lister les compétences par tâche
 - Vous établissez pour chaque tâche la liste des compétences requises sous forme matricielle.
- Étape 2 : Consultez les managers
 - Vous demandez aux chefs d'équipe de vous fournir les éventuelles matrices de compétences de leurs équipes ou bien vous les établissez vous-même à partir des informations que ces managers vous fournissent.
Essayez de discuter avec eux pour bien établir ces matrices de compétences.
- Étape 3 : Croisez les tâches et les ressources pour accomplir les tâches
 - Croisez les tâches et les ressources possibles pour accomplir ces tâches. Si votre projet nécessite des compétences spécifiques, par exemple la maîtrise d'un nouveau langage informatique, la maîtrise d'aspects juridiques complexes ...
 - Sachez bien les identifier pour justifier vos besoins en ressources auprès de la Direction. Ces besoins pourront alors se traduire en fonction de la nature du projet en besoins en nouvelles ressources humaines ou bien en formations de ressources présentes.
 - Si le projet est jugé stratégique pour votre Direction, il sera aussi plus facile d'obtenir de la disponibilité de la part des ressources présentes dans l'entreprise.

Dans l'étape 2, il est possible de réaliser un test d'intérêt des futurs collaborateurs envers l'une ou l'autre tâche.
